


2週間作業予定表

工事名:令和4年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路橋梁下部工(P9)工事

施工者:りんかい日産建設株式会社

鹿児島港作業所TEL:099-297-5318

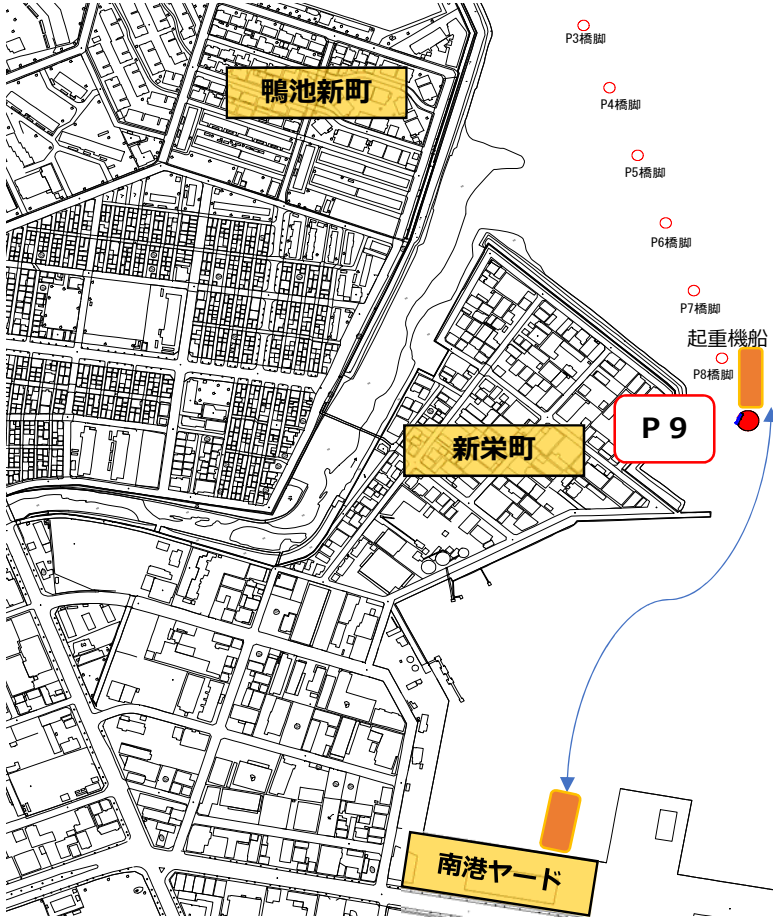

使用船舶
【起重機船】55t吊



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
3/20	(月)	鋼管矢板継手内掘削	P9	3月27日	(月)	継手内モルタル	P9
3/21	(火)	休工		3月28日	(火)	継手内モルタル	P9
3/22	(水)	鋼管矢板継手内掘削	P9	3月29日	(水)	継手内モルタル	P9
3/23	(木)	鋼管矢板継手内掘削	P9	3月30日	(木)	止水モルタル	P9
3/24	(金)	鋼管矢板継手内掘削 継手内モルタル準備	P9	3月31日	(金)	止水モルタル	P9
3/25	(土)	休工		4月1日	(土)	休工	
3/26	(日)	休工		4月2日	(日)	休工	
備考	朝は南港→P9 夕方P9→南港へ航行します。			備考	朝は南港→P9 夕方P9→南港へ航行します。		
