


2週間作業予定表

工事名:令和4年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路橋梁下部工(P9)工事

施工者:りんかい日産建設株式会社

鹿児島港作業所TEL:099-297-5318

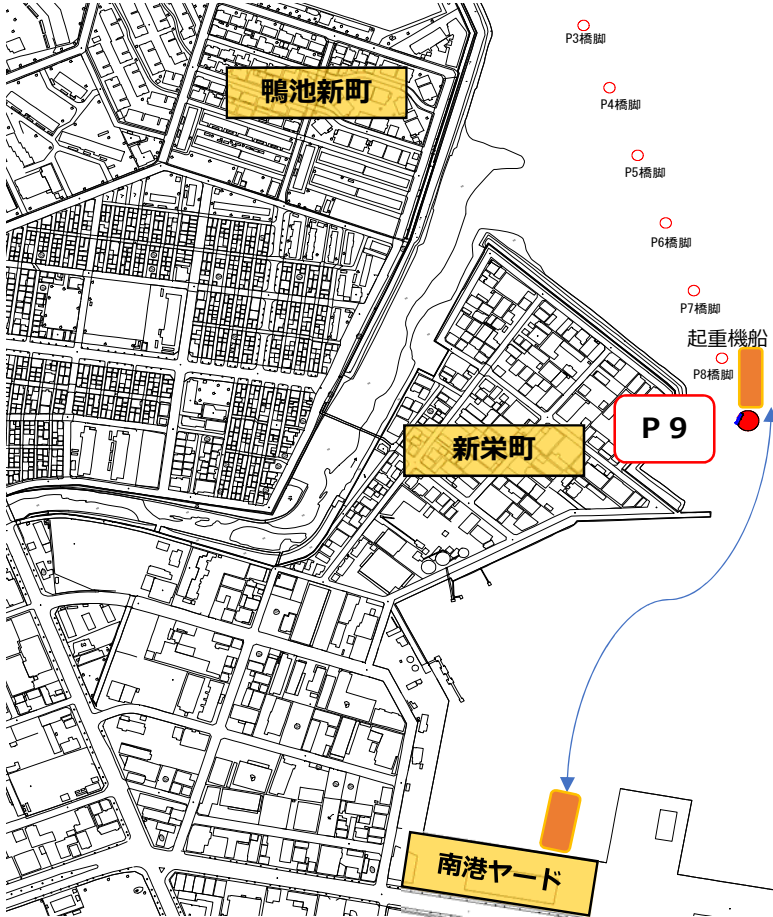

仮設工

支保リング設置



2層目支保工取付状況

- ・井筒内の水抜きの際、外側からの水圧や土圧で鋼管矢板が倒壊しない様に内側に支保リングを設置していきます。
- ・2、3段目の支保リング設置後は井筒内の土砂を約12m掘削します。

使用船舶

【起重機船】 120t吊

【起重機船】 55t吊



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
4/3	(月)	支保リング設置(2段目) 施工準備	P9	4月10日	(月)	支保リング設置予備日	P9
4/4	(火)	支保リング設置(2段目) 支保リング設置・間詰コン型枠	P9	4月11日	(火)	井筒内掘削	P9
4/5	(水)	支保リング設置(2段目) 間詰コンクリート	P9	4月12日	(水)	井筒内掘削	P9
4/6	(木)	支保リング設置(3段目) 支保リング設置・間詰コン型枠	P9	4月13日	(木)	井筒内掘削	P9
4/7	(金)	支保リング設置(3段目) 間詰コンクリート	P9	4月14日	(金)	井筒内掘削	P9
4/8	(土)	休工		4月15日	(土)	休工	
4/9	(日)	休工		4月16日	(日)	休工	
備考		朝は南港→P9 夕方P9→南港へ航行します。		備考		朝は南港→P9 夕方P9→南港へ航行します。	
