


## 2週間作業予定表

工事名: 令和4年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路橋梁下部工(P9)工事

施工者: りんかい日産建設株式会社

鹿児島港作業所TEL: 099-297-5318

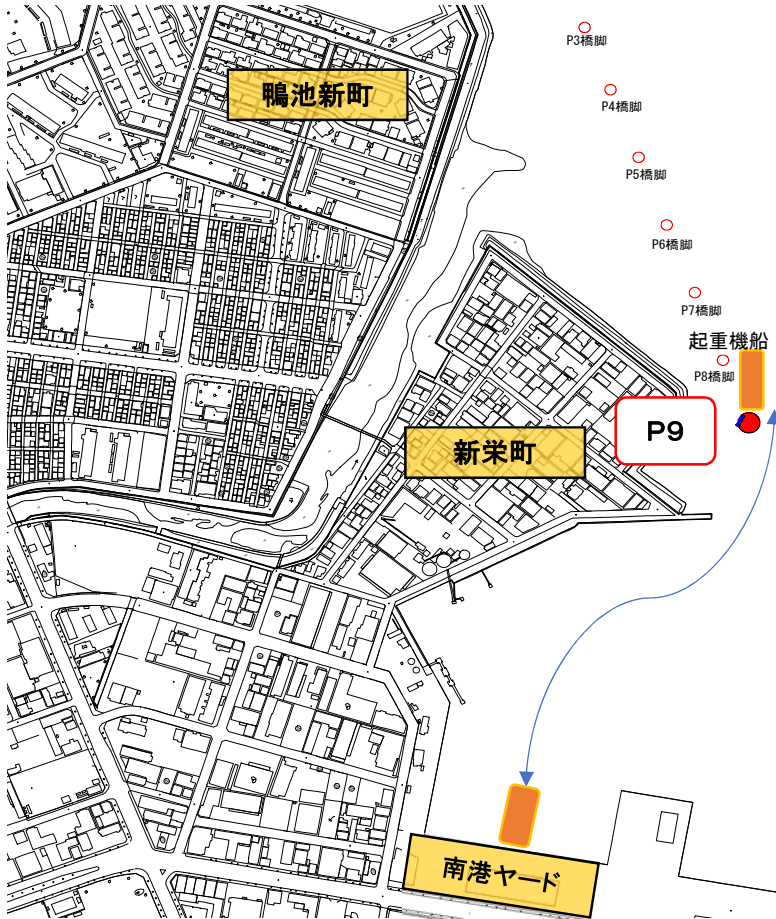

### 躯体工

足場・鉄筋組立状況

・7月26日に頂版コンクリート打設を行いました。  
 ・いよいよ橋梁の柱部分の組立に入っていきます。  
 ・足場→鉄筋→型枠→コンクリートを繰り返して4サイクルで打ち上げます。

**使用船舶**  
 【コンクリートミキサー船】  
 【起重機船】55t吊



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
7/31	(月)	躯体足場組立 型枠建込段取り	P9	8月7日	(月)	休工(台風警戒)	木材港
8/1	(火)	休工(台風警戒)	木材港	8月8日	(火)	休工(台風警戒)	木材港
8/2	(水)	休工(台風警戒)	木材港	8月9日	(水)	台風警戒解除・復旧	木材港
8/3	(木)	休工(台風警戒)	木材港	8月10日	(木)	台風警戒解除・復旧	木材港
8/4	(金)	休工(台風警戒)	木材港	8月11日	(金)	休工	
8/5	(土)	休工	木材港	8月12日	(土)	休工	
8/6	(日)	休工		8月13日	(日)	休工	
備考	台風の進路により作業変更あり。			備考	台風の進路により作業変更あり。		





別件工事: P3橋脚

コンクリートミキサー船

起重機船(揚重作業)

P9橋脚



(令和5年7/26 撮影: 頂版コンクリート打設状況 りんかい日産建設(株))
