


## 2週間作業予定表

工事名:令和4年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路橋梁下部工(P9)工事

施工者:りんかい日産建設株式会社

鹿児島港作業所TEL:099-297-5318

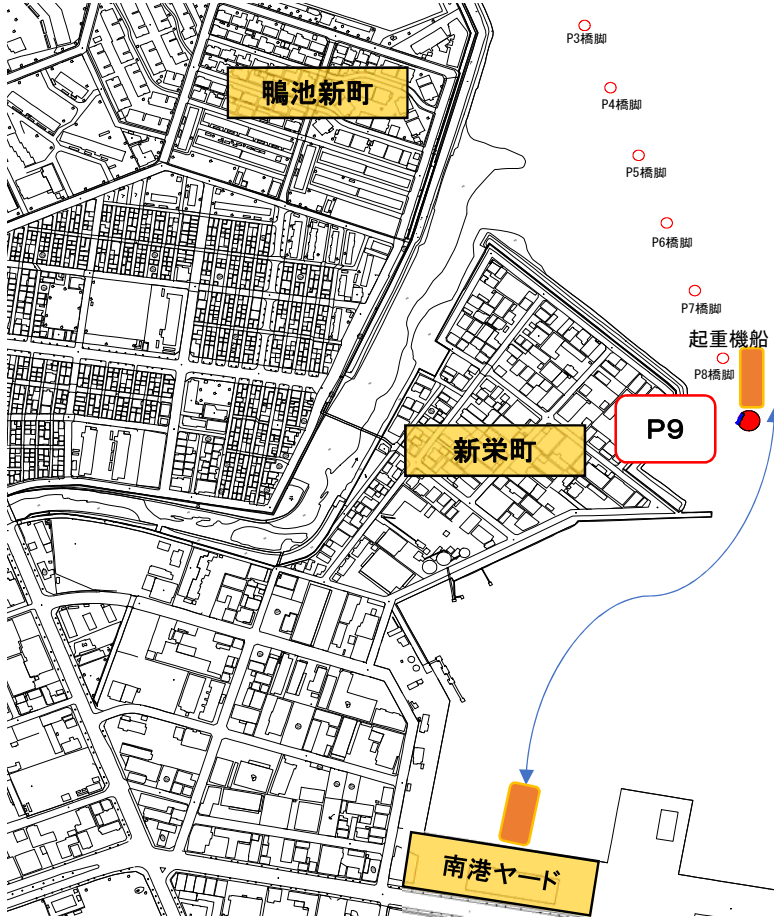

### 躯体工

躯体型枠組立状況(2Lot)



- ・足場→鉄筋→型枠→コンクリートの施工を繰り返しコンクリート打設を残り3回打継いでいきます。
- ・19日の週は2Lot目の型枠～コンクリート打設作業です。

**使用船舶**  
**【起重機船】120t吊**  
**【起重機船】55t吊**  
**【フェリーバージ】800t積**



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
9/18	(月)	休工	南港	9月25日	(月)	測量	P9
9/19	(火)	型枠組立(2Lot)	P9	9月26日	(火)	躯体鉄筋組立(3Lot)	P9
9/20	(水)	型枠組立(2Lot)	P9	9月27日	(水)	躯体鉄筋組立(3Lot)	P9
9/21	(木)	躯体コンクリート打設(2Lot)	P9	9月28日	(木)	躯体鉄筋組立(3Lot)	P9
9/22	(金)	コンクリート養生	P9	9月29日	(金)	躯体鉄筋組立(3Lot)	P9
9/23	(土)	休工	南港	9月30日	(土)	休工	南港
9/24	(日)	休工	南港	10月1日	(日)	休工	南港
備考	21日はコンクリート打設のため、フェリーバージ1隻が南港⇄P9を6往復します。			備考			
