


工事名： 令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第2次)

【作業予定表】

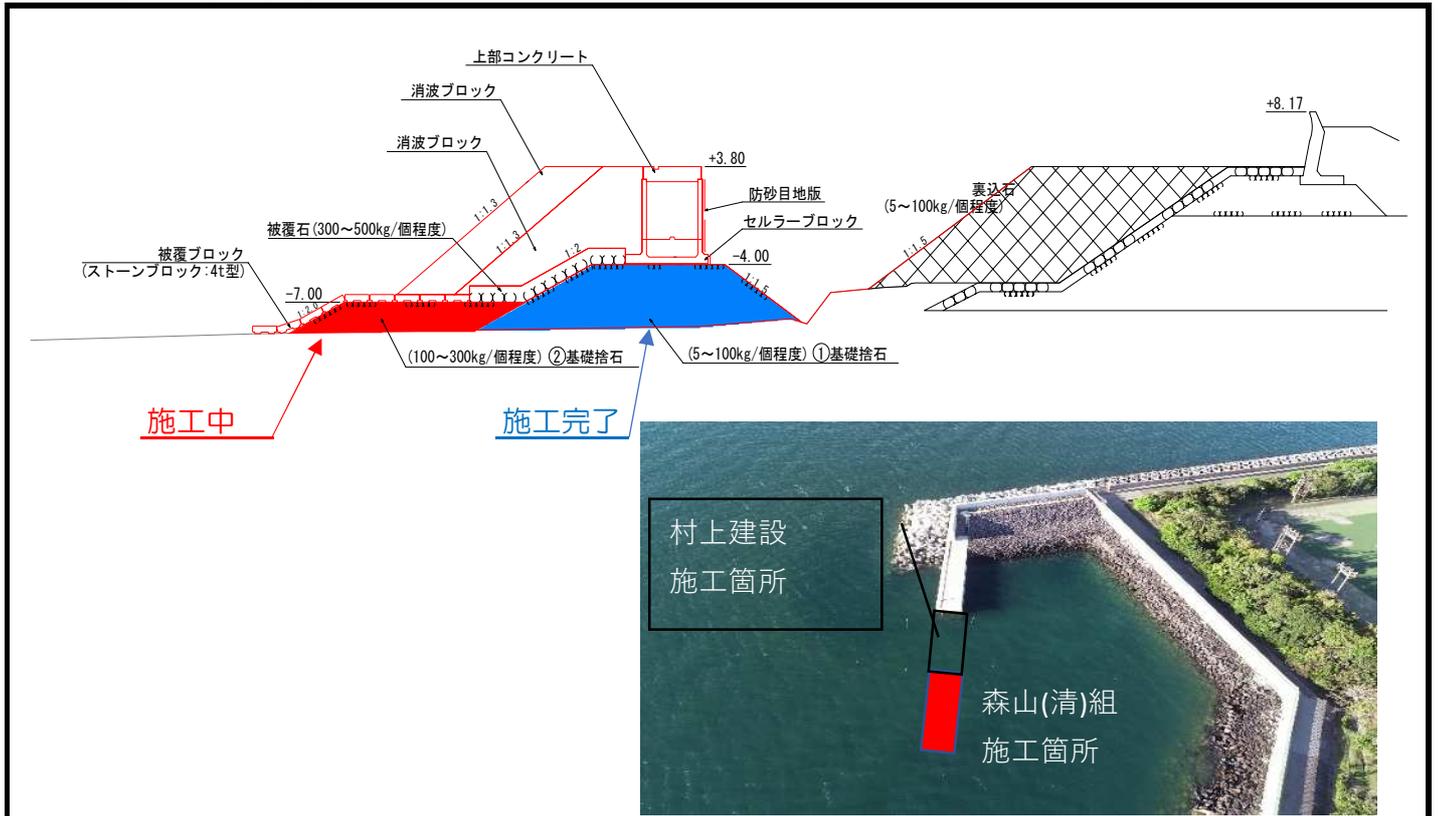

日付	曜日	作業内容	日付	曜日	作業内容
9月11日	月	基礎工① 水中部出来形確認	9月18日	月	基礎工② 捨石荒均し
9月12日	火	隣接工区調整の為、 9/16振替休日	9月19日	火	基礎工② 捨石荒均し
9月13日	水	隣接工区調整の為、 9/18振替休日	9月20日	水	基礎工② 捨石荒均し
9月14日	木	基礎工② 捨石(100~300kg)投入	9月21日	木	基礎工② 捨石荒均し
9月15日	金	基礎工② 丁張設置	9月22日	金	基礎工② 捨石荒均し
9月16日	土	基礎工② 捨石荒均し	9月23日	土	休工
9月17日	日	休工	9月24日	日	休工

備考 ※天候等により作業内容・作業日が変更となる場合があります。
