


工事名： 令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第2次)

【2週間作業予定表】

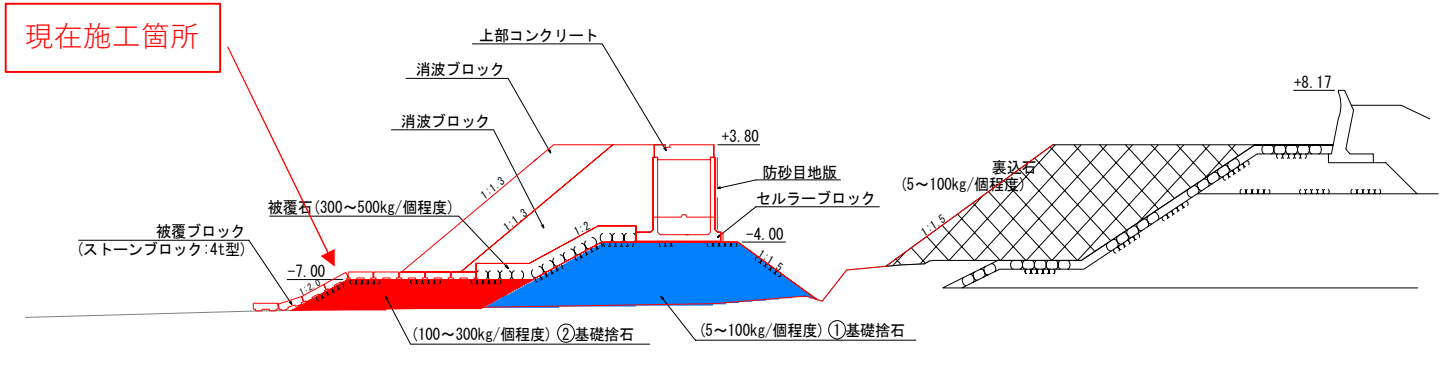

日付	曜日	作業内容	日付	曜日	作業内容
9月25日	月	休工 振替休日(9月30日作業)	10月2日	月	共通工：灯浮標管理 基礎工②:捨石荒均し出来形測定
9月26日	火	共通工：灯浮標管理 基礎工②:捨石投入準備	10月3日	火	隣接工区調整の為、休工 振替休日(10月14日作業)
9月27日	水	共通工：灯浮標管理 基礎工②:捨石(100~300kg)投入	10月4日	水	隣接工区調整の為、休工 振替休日(10月15日作業)
9月28日	木	共通工：灯浮標管理 基礎工②:捨石荒均し	10月5日	木	共通工：灯浮標管理
9月29日	金	共通工：灯浮標管理 基礎工②:捨石荒均し	10月6日	金	共通工：灯浮標管理 基礎工②：水中部出来形確認
9月30日	土	共通工：灯浮標管理 基礎工②:捨石荒均し	10月7日	土	休工
10月1日	日	休工	10月8日	日	休工

※天候・進捗等により作業内容・作業日が変更となる場合があります。

備考
