


## 2週間作業予定表

工事名:令和4年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路橋梁下部工(P9)工事

施工者:りんかい日産建設株式会社

鹿児島港作業所TEL:099-297-5318

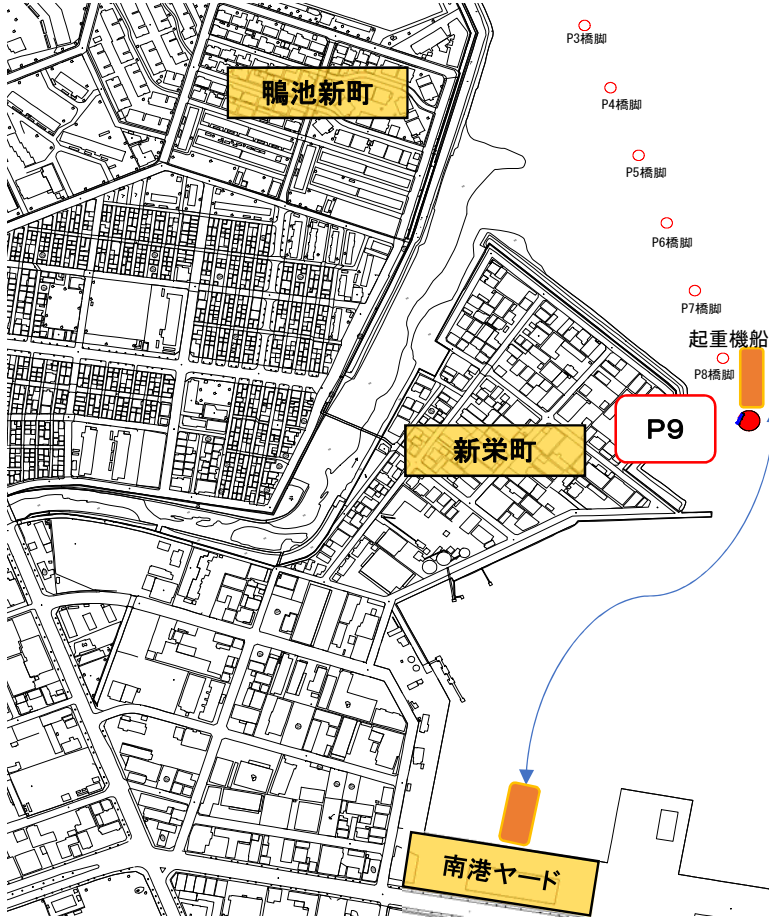

### 躯体工

躯体鉄筋組立状況(4Lot)



- ・足場→鉄筋→型枠→コンクリートの施工を残り1サイクル行っています。
- ・4Lot目のコンクリート打設は11月7日を予定しています。

**使用船舶**  
**【起重機船】120t吊**  
**【起重機船】55t吊**



月日	曜日	作業予定	日中作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	日中作業船の係留場所
10/30	(月)	躯体型枠準備(4Lot)	南港	11月6日	(月)	躯体型枠組立(4Lot)	P9
10/31	(火)	躯体型枠組立(4Lot)	P9	11月7日	(火)	躯体コンクリート打設(4Lot)	P9
11/1	(水)	躯体型枠組立(4Lot)	P9	11月8日	(水)	コンクリート養生	P9
11/2	(木)	躯体型枠組立(4Lot)	P9	11月9日	(木)	休工	11月3日の振替
11/3	(金)	躯体型枠組立(4Lot)	P9	11月10日	(金)	沓座型枠組立	P9
11/4	(土)	休工	南港	11月11日	(土)	休工	南港
11/5	(日)	休工	南港	11月12日	(日)	休工	南港
備考				備考		11月7日はコンクリート打設に伴いコンクリートミキサー車運搬用のフェリーバージが南港⇄P9を5航海します。	
