


2週間作業予定表

工事名:令和4年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路橋梁下部工(P9)工事

施工者:りんかい日産建設株式会社

鹿児島港作業所TEL:099-297-5318

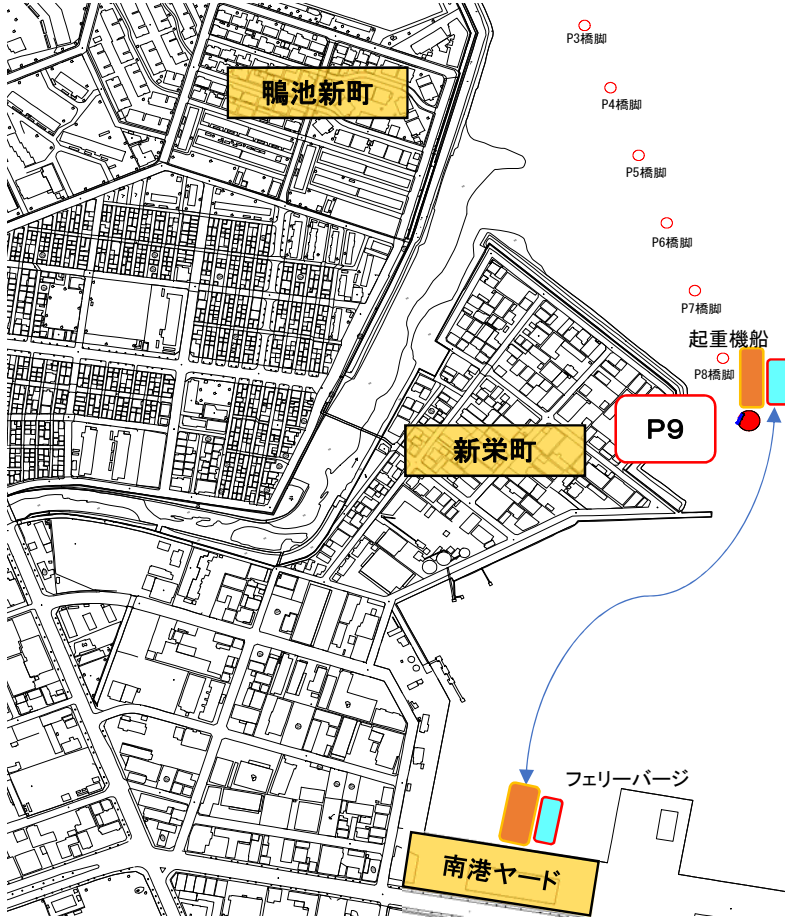

躯体工

躯体鉄筋組立状況(3Lot)

- ・足場→鉄筋→型枠→コンクリートの施工を繰返しコンクリート打設を残り2回打継いでいきます。
- ・10月2日の週は3Lot目の型枠組立～コンクリート打設作業です。
- ・6日はフェリーバージがP9⇄南港を6往復します。

使用船舶
【起重機船】120t吊
【起重機船】55t吊
【フェリーバージ】800t積



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
10/2	(月)	休工	南港	10月9日	(月)	休工	P9
10/3	(火)	型枠脱枠準備(2Lot)		10月10日	(火)	コンクリート養生	南港
10/4	(水)	型枠脱枠(2Lot) 型枠建込(3Lot)	P9	10月11日	(水)	躯体コンクリート(4Lot) 施工準備	南港
10/5	(木)	型枠組立(3Lot)	P9	10月12日	(木)	躯体コンクリート(4Lot) 施工準備	南港
10/6	(金)	コンクリート打設(3Lot)	P9	10月13日	(金)	躯体コンクリート(4Lot) 施工準備	南港
10/7	(土)	コンクリート養生(3Lot) レイトランス処理	P9	10月14日	(土)	休工	南港
10/8	(日)	休工	南港	10月15日	(日)	休工	南港
備考	6日はコンクリート打設のため、フェリーバージ1隻が南港⇄P9を6往復します。			備考			



(令和5年 9月21日 撮影：躯体コンクリート(2Lot)打設状況)
