


## 2週間作業予定表

工事名:令和4年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路橋梁下部工(P9)工事

施工者:りんかい日産建設株式会社

鹿児島港作業所TEL:099-297-5318

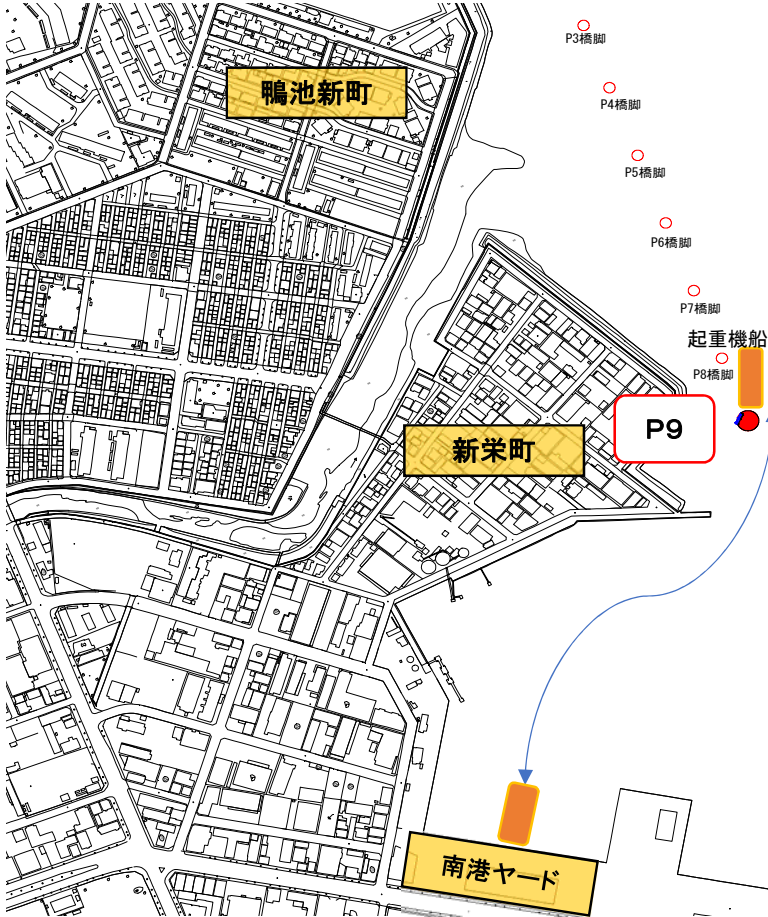

### 躯体工

躯体コンクリート打設状況(3Lot)



- ・足場→鉄筋→型枠→コンクリートの施工を残り1サイクル行います。
- ・4Lot目のコンクリート打設は11月7日を予定しています。

使用船舶  
【起重機船】120t吊  
【起重機船】55t吊



月日	曜日	作業予定	日中作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	日中作業船の係留場所
10/16	(月)	足場・支保工組立	P9	10月23日	(月)	躯体鉄筋組立(4Lot)	P9
10/17	(火)	足場・支保工組立	P9	10月24日	(火)	躯体鉄筋組立(4Lot)	P9
10/18	(水)	足場・支保工組立	P9	10月25日	(水)	躯体鉄筋組立(4Lot)	P9
10/19	(木)	型枠脱枠(3Lot) 梁底部型枠組立	P9	10月26日	(木)	躯体鉄筋組立(4Lot)	P9
10/20	(金)	型枠脱枠(3Lot) 梁底部型枠組立	P9	10月27日	(金)	躯体鉄筋組立(4Lot)	P9
10/21	(土)	休工	南港	10月28日	(土)	休工	南港
10/22	(日)	休工	南港	10月29日	(日)	休工	南港
備考				備考			
