


工事名： 令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第2次)

【 2週間作業予定表 】

完了箇所 作業中

断面図

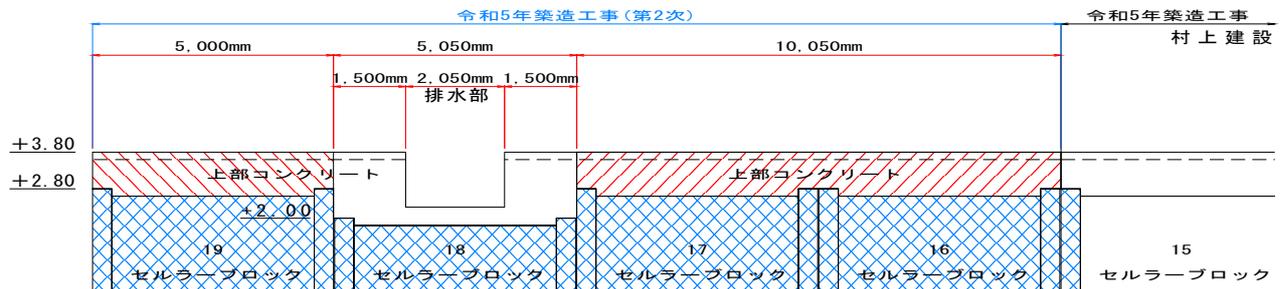

型枠組立



コンクリート打設

日付	曜日	作業内容	日付	曜日	作業内容
11月6日	月	上部工 脱枠	11月13日	月	上部工 脱枠
11月7日	火	上部工 型枠組立	11月14日	火	上部工 片付け・美装
11月8日	水	上部工 型枠組立	11月15日	水	上部工 片付け・美装
11月9日	木	上部工 型枠組立	11月16日	木	上部工 片付け・美装
11月10日	金	上部工 コンクリート打設	11月17日	金	上部工 片付け・美装
11月11日	土	休工	11月18日	土	休工
11月12日	日	休工	11月19日	日	休工
備考	※天候等により作業内容・作業日が変更となる場合があります。				



株式会社 森山(清)組  
TEL 099-252-1313  
www.moriyamasei.co.jp
