
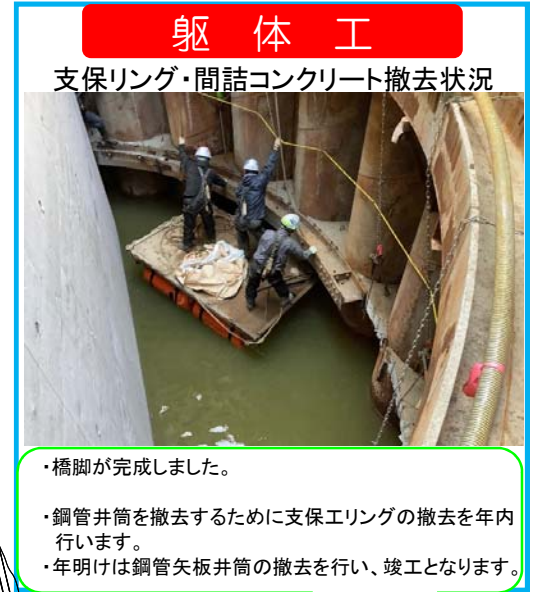


2週間作業予定表

工事名:令和4年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路橋梁下部工(P9)工事

施工者:りんかい日産建設株式会社

鹿児島港作業所TEL:099-297-5318

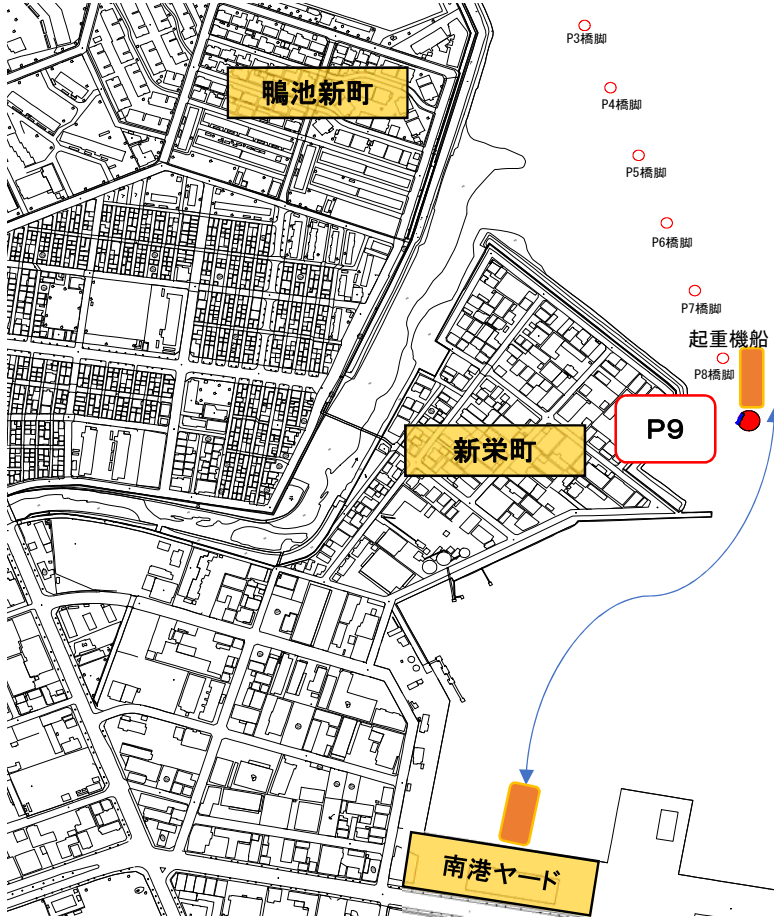

使用船舶
【起重機船】120t吊
【起重機船】55t吊



月日	曜日	作業予定	日中作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	日中作業船の係留場所
12/11	(月)	井筒内埋戻し土砂投入	P9	12月18日	(月)	支保リング撤去(2段目)	P9
12/12	(火)	井筒内埋戻し土砂投入	P9	12月19日	(火)	支保リング撤去(1段目)	P9
12/13	(水)	支保リング撤去(3段目)	P9	12月20日	(水)	支保リング撤去(1段目)	P9
12/14	(木)	支保リング撤去(3段目)	P9	12月21日	(木)	支保リング撤去(1段目)	P9
12/15	(金)	支保リング撤去(2段目)	P9	12月22日	(金)	仮設構台撤去	P9
12/16	(土)	休工	南港	12月23日	(土)	休工	南港
12/17	(日)	休工	南港	12月24日	(日)	休工	南港
備考				備考			



井筒の中から躯体を見上げた写真

(令和5年12月 6日 撮影：支保リング・間詰コンクリート撤去)
