

工事名： 令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事
2週間作業予定

施工者： 村上建設株式会社



月日	曜日	作業予定	作業船 係留場所
12月18日	月	上部工②コンクリート打設	200t吊起重機船 南港帰港
		被覆工 石材均し	潜水士船作業終了 後木材港へ帰港
12月19日	火	振替休工	//
12月20日	水	上部工②型枠組立	200t吊起重機船 現場停泊
		被覆工 石材均し	潜水士船作業終了 後木材港へ帰港
12月21日	木	上部工②型枠組立	200t吊起重機船 南港帰港
		被覆工 石材均し	潜水士船作業終了 後木材港へ帰港
12月22日	金	上部工②コンクリート打設	200t吊起重機船 南港帰港
		被覆工 石材均し	潜水士船作業終了 後木材港へ帰港
12月23日	土	休日	//
12月24日	日	上部工②型枠組立	200t吊起重機船 現場停泊
		被覆工 石材均し	潜水士船作業終了 後木材港へ帰港
備考	隣接工区との作業の調整があるので予定 と若干変更が有るかもしれません		

月日	曜日	作業予定	作業船 係留場所
12月25日	月	上部工②型枠組立	200t吊起重機船 南港帰港
		被覆工 石材均し	潜水士船作業終了 後木材港へ帰港
12月26日	火	上部工②コンクリート打設	200t吊起重機船 南港帰港
		被覆工 石材均し	潜水士船作業終了 後木材港へ帰港
12月27日	水	振替休工	//
12月28日	木	資材片づけ	200t吊起重機船 南港帰港
		被覆工 石材均し	潜水士船作業終了 後木材港へ帰港
12月29日	金	年末年始休暇	//
12月30日	土	//	//
12月31日	日	//	//
連絡先	村上建設 現場代理人	野田 孝幸 090-5749-3512	

前週の作業一連

上部工② 型枠組立




上部工② コンクリート打設



裏込工 裏込石材投入



裏込工 裏込石材投入

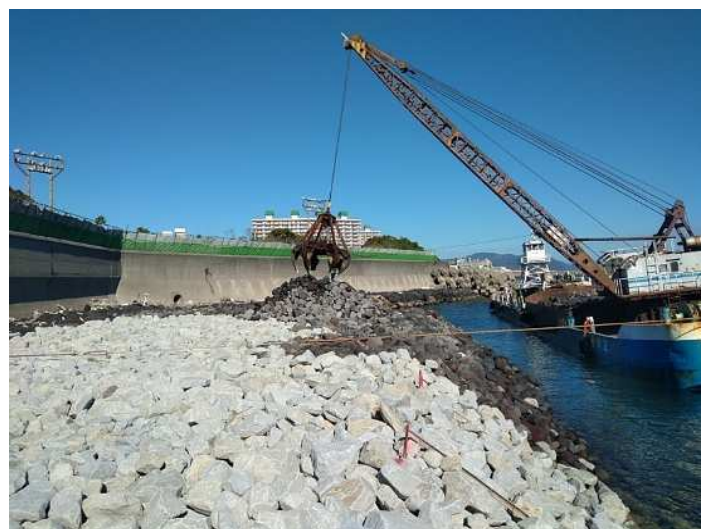

被覆・根固工 被覆石投入



被覆・根固工 被覆石投入

