



工事名： 令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第2次)

【 2週間作業予定表 】

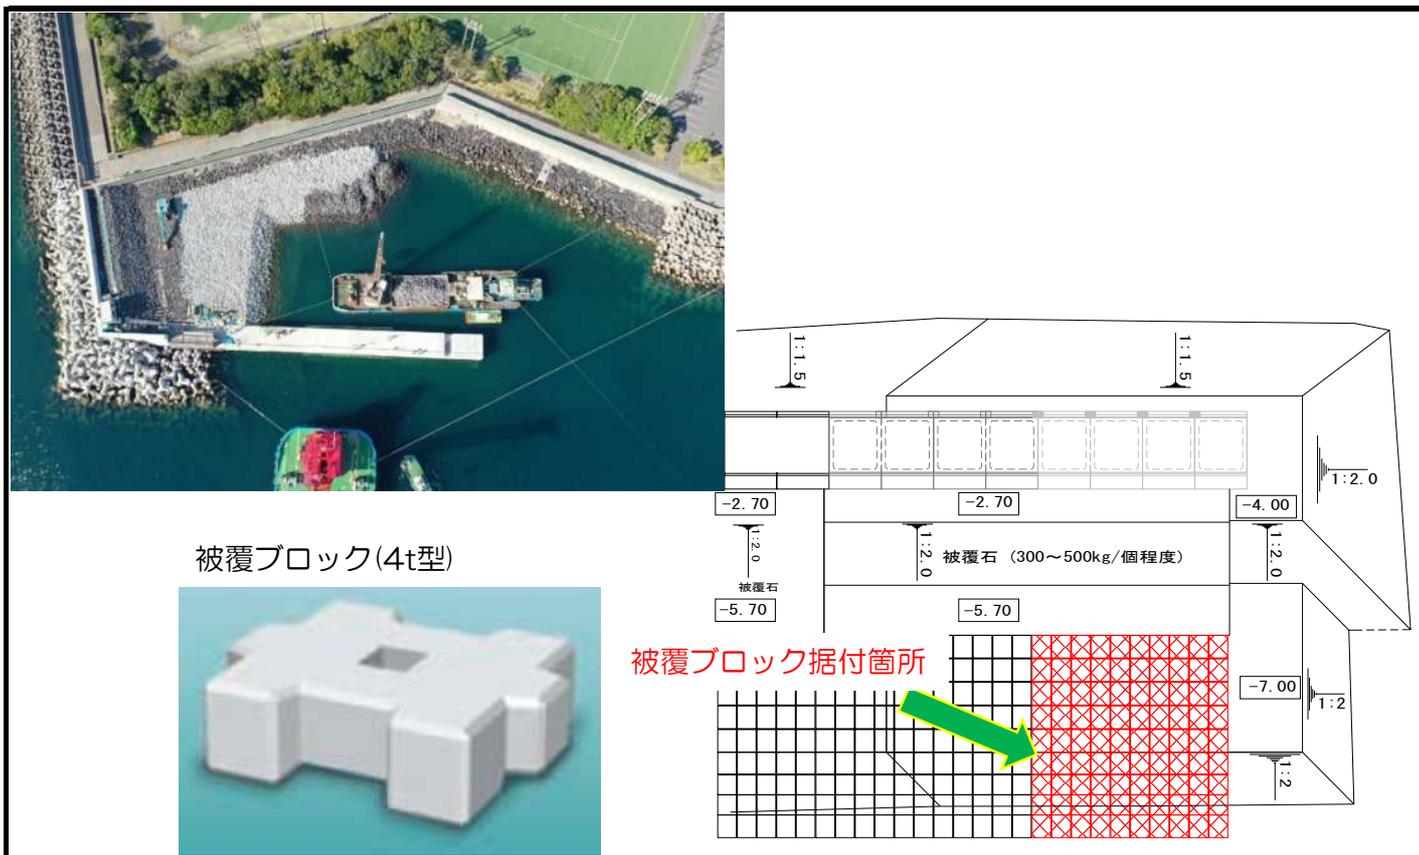

被覆ブロック(4t型)

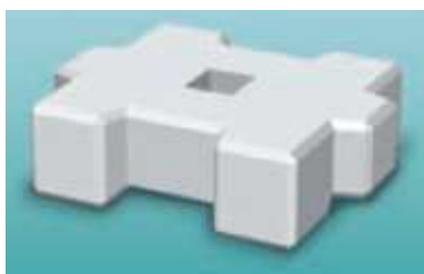

日付	曜日	作業内容	日付	曜日	作業内容
12月4日	月	被覆・根固工 ブロック据付(4t型)	12月11日	月	被覆・根固工 投入位置出し
12月5日	火	被覆・根固工 ブロック据付(4t型)	12月12日	火	被覆・根固工 被覆石(300~500kg)投入
12月6日	水	被覆・根固工 ブロック据付(4t型)	12月13日	水	被覆・根固工 被覆石均し
12月7日	木	被覆・根固工 出来形測量	12月14日	木	被覆・根固工 被覆石均し
12月8日	金	裏込工、被覆・根固工 水中部出来形検査	12月15日	金	被覆・根固工 被覆石均し
12月9日	土	休工	12月16日	土	休工
12月10日	日	休工	12月17日	日	休工
備考	※天候等により作業内容・作業日が変更となる場合があります。				



株式会社 森山(清)組
TEL 099-252-1313
www.moriyamasei.co.jp
