


工事名： 令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第2次)

【2週間作業予定表】

施工箇所

2/9現在
消波ブロック据付
(12t型 239個)
(8t型 409個) 328個完了

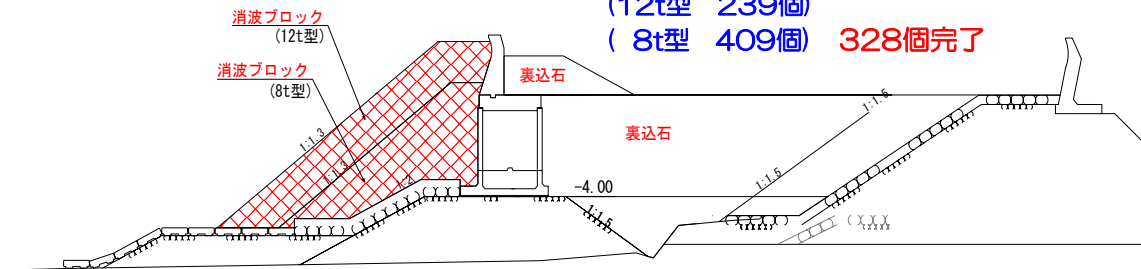

消波工



12t型
新設ブロック



8t型
既設ブロック



日付	曜日	作業内容	日付	曜日	作業内容
2月12日	月	休工	2月19日	月	消波工 ブロック(12t型)積込
2月13日	火	消波工 ブロック(8t型)積込	2月20日	火	消波工 ブロック(12t型)据付
2月14日	水	消波工 ブロック据付	2月21日	水	消波工 ブロック(12t型)据付
2月15日	木	裏込工 出来形検査(陸上部) 消波工 ブロック据付	2月22日	木	消波工 ブロック(12t型)積込
2月16日	金	裏込工 出来形検査(水中部)	2月23日	金	休工
2月17日	土	休工	2月24日	土	休工
2月18日	日	休工	2月25日	日	休工
備考	※天候等により作業内容・作業日が変更となる場合があります。				



株式会社 森山(清)組
TEL 099-252-1313
www.moriyamasei.co.jp

ともに前へ
1100年の誇り、未来への礎
