


工事名： 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第3次)

【作業予定表】

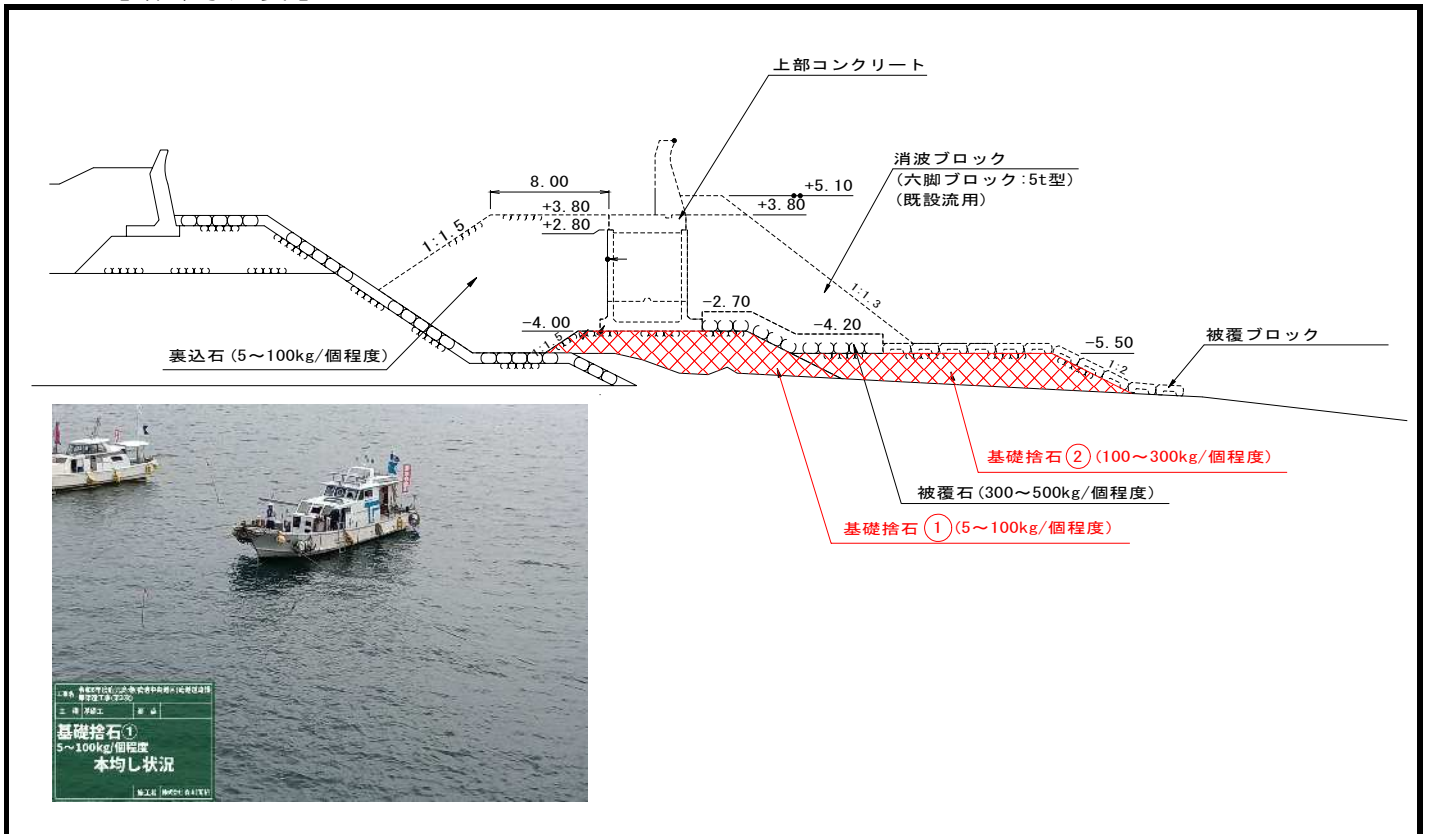

日付	曜日	作業内容	日付	曜日	作業内容
10月21日	月	基礎工 基礎捨石① 本均し	10月28日	月	基礎工 基礎捨石① 出来形検測
10月22日	火	基礎工 基礎捨石① 本均し	10月29日	火	基礎工 基礎捨石① 水中部出来形検査
10月23日	水	基礎工 基礎捨石① 本均し	10月30日	水	基礎工 基礎捨石② 雑石100~300kg投入
10月24日	木	基礎工 基礎捨石① 本均し	10月31日	木	基礎工 基礎捨石② 荒均し
10月25日	金	基礎工 基礎捨石① 本均し	11月1日	金	基礎工 基礎捨石② 荒均し
10月26日	土	休工	11月2日	土	休工
10月27日	日	休工	11月3日	日	休工
備考	※天候等により作業内容・作業日が変更となる場合があります。				
