


工事名： 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事

2週間作業予定

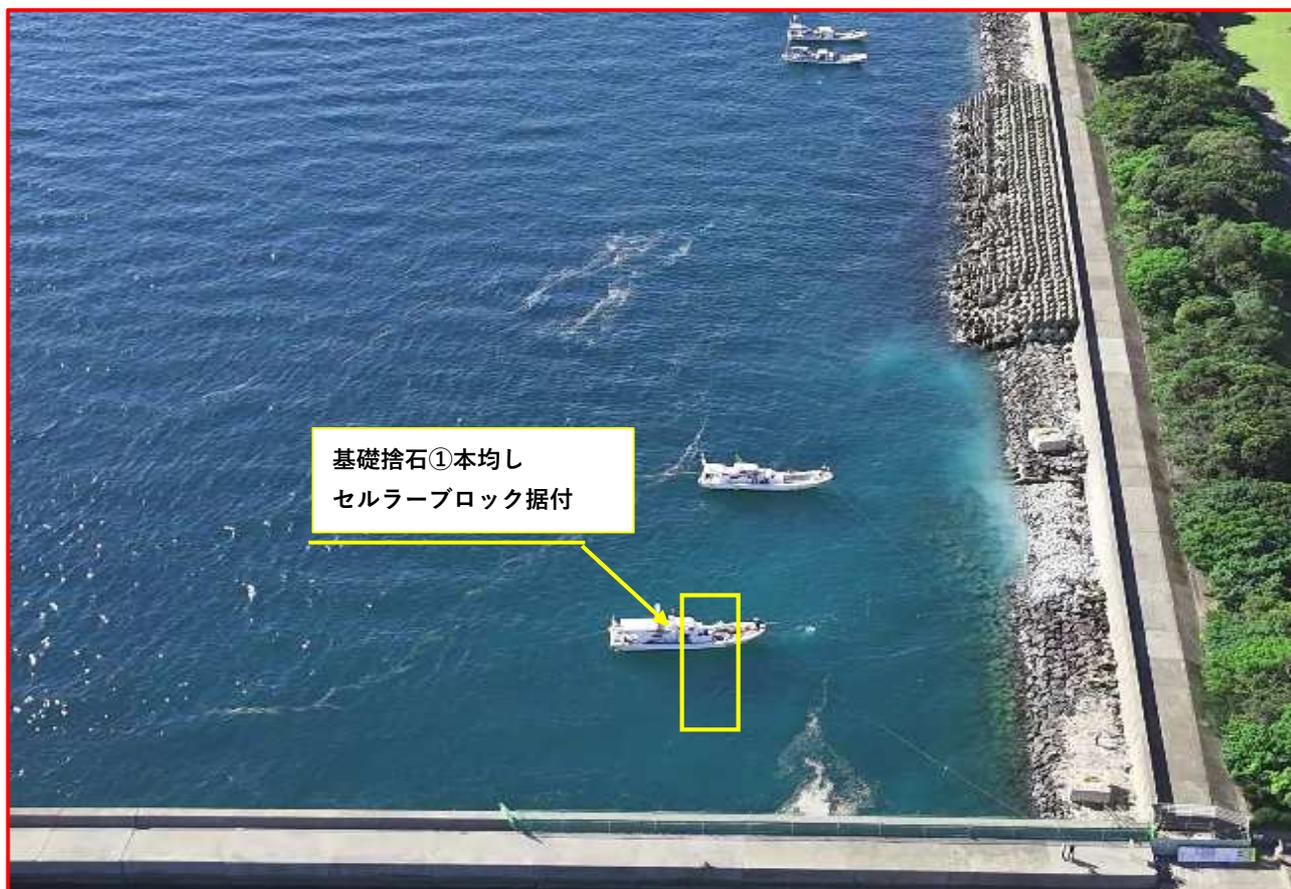

月日	曜日	作業予定	作業船 係留場所
11月18日	月	休 工	南港停泊
11月19日	火	休 工	南港停泊
11月20日	水	本體工 セルラーブロック据付 準備	現場停泊
11月21日	木	本體工 セルラーブロック据付	現場停泊
11月22日	金	本體工 セルラーブロック据付	現場停泊
11月23日	土	本體工 中詰石材投入	現場停泊
11月24日	日	本體工 中詰石材投入	現場停泊
備考	天候により作業内容及び係留場所は変更 が有ります。		

月日	曜日	作業予定	作業船 係留場所
11月25日	月	本體工 中詰石材均し	南港停泊
11月26日	火	本體工 中詰石材均し	南港停泊
11月27日	水	上部工 コンクリート打設 (蓋コンクリート)	南港停泊
11月28日	木	裏込工 防砂目地板設置	南港停泊
11月29日	金	裏込工 防砂目地板設置	南港停泊
11月30日	土	休工	南港停泊
12月1日	日	休工	南港停泊
連絡先	村上建設 現場代理人	藤川 福男 090-6292-1738	
