


工事名： 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第7次)

2週間作業予定

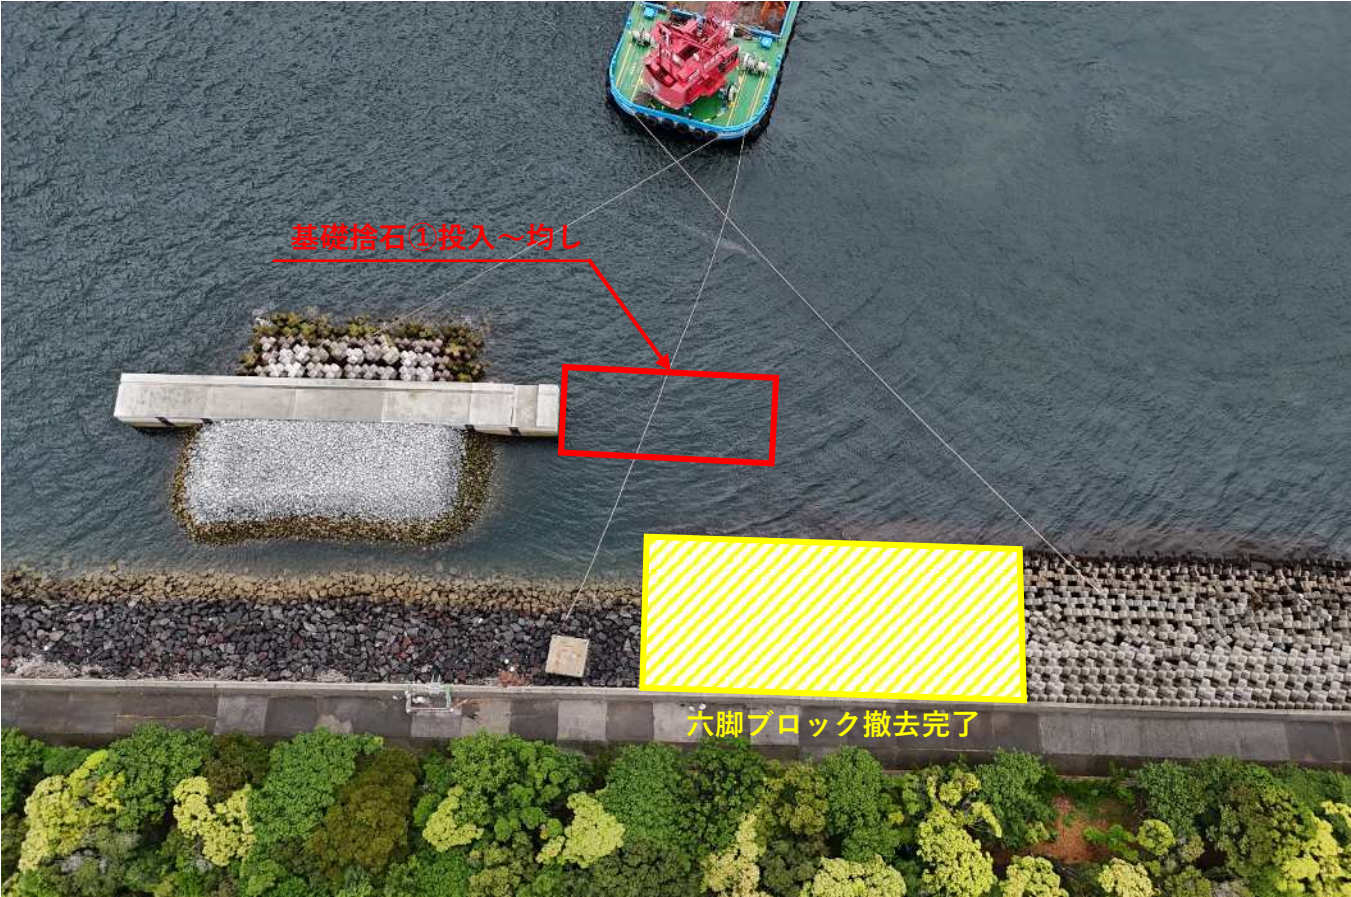

月日	曜日	作業予定	作業船 係留場所
6月16日	月	構造物撤去工 六脚ブロック陸上仮置	南港停泊
6月17日	火	構造物撤去工 艀装解除・起重機船出港	係留なし
6月18日	水	深浅測量	係留なし
6月19日	木	本作業なし 基礎捨石①準備	係留なし
6月20日	金	本作業なし 基礎捨石①準備	係留なし
6月21日	土	休工	係留なし
6月22日	日	休工	係留なし
備考	天候により作業内容及び係留場所は変更 が有ります。		

月日	曜日	作業予定	作業船 係留場所
6月23日	月	基礎捨石工① 捨石投入	係留なし
6月24日	火	基礎捨石工① 捨石投入	係留なし
6月25日	水	基礎捨石工① 捨石本均し	係留なし
6月26日	木	基礎捨石工① 捨石本均し	係留なし
6月27日	金	基礎捨石工① 捨石本均し	係留なし
6月28日	土	休工	係留なし
6月29日	日	休工	係留なし
連絡先	 村上建設株式会社 0997-52-0625		
