


工事名：令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路橋梁上部工(P6～P9)工事
川田工業株式会社 2週間作業予定表

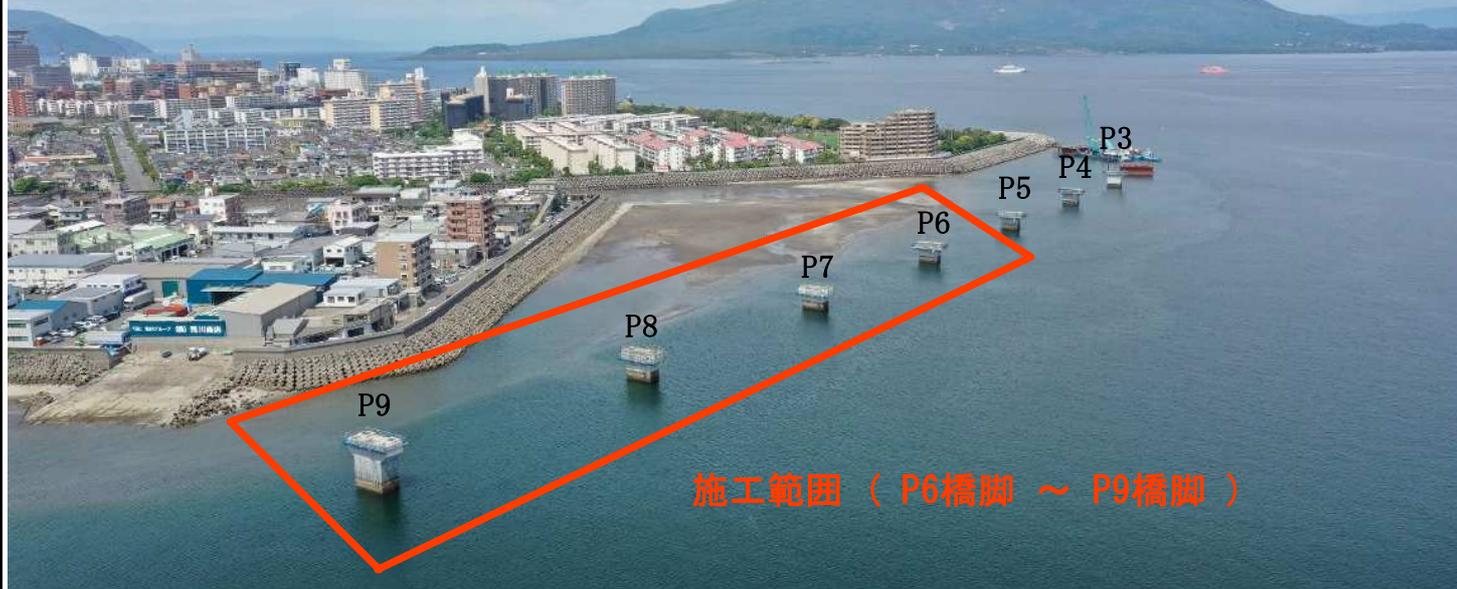

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
6/2	(月)	セッティングビーム 周り足場組立(陸上)	—	6/9	(月)	下部工検査路設置 沓座チッピング(海上)	南港7号岸壁
6/3	(火)	セッティングビーム 周り足場組立(陸上)	—	6/10	(火)	下部工検査路設置 沓座チッピング(海上)	南港7号岸壁
6/4	(水)	セッティングビーム 周り足場組立(陸上)	—	6/11	(水)	下部工検査路設置 沓座チッピング(海上)	南港7号岸壁
6/5	(木)	セッティングビーム 周り足場組立(陸上)	—	6/12	(木)	橋脚上アンカー削孔 支承据付(海上)	南港7号岸壁
6/6	(金)	セッティングビーム 周り足場組立(陸上)	—	6/13	(金)	橋脚上アンカー削孔 支承据付(海上)	南港7号岸壁
6/7	(土)	休 工	—	6/14	(土)	休 工	—
6/8	(日)	休 工	—	6/15	(日)	休 工	—
備 考		天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。					
