


工事名： 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第7次)

2週間作業予定

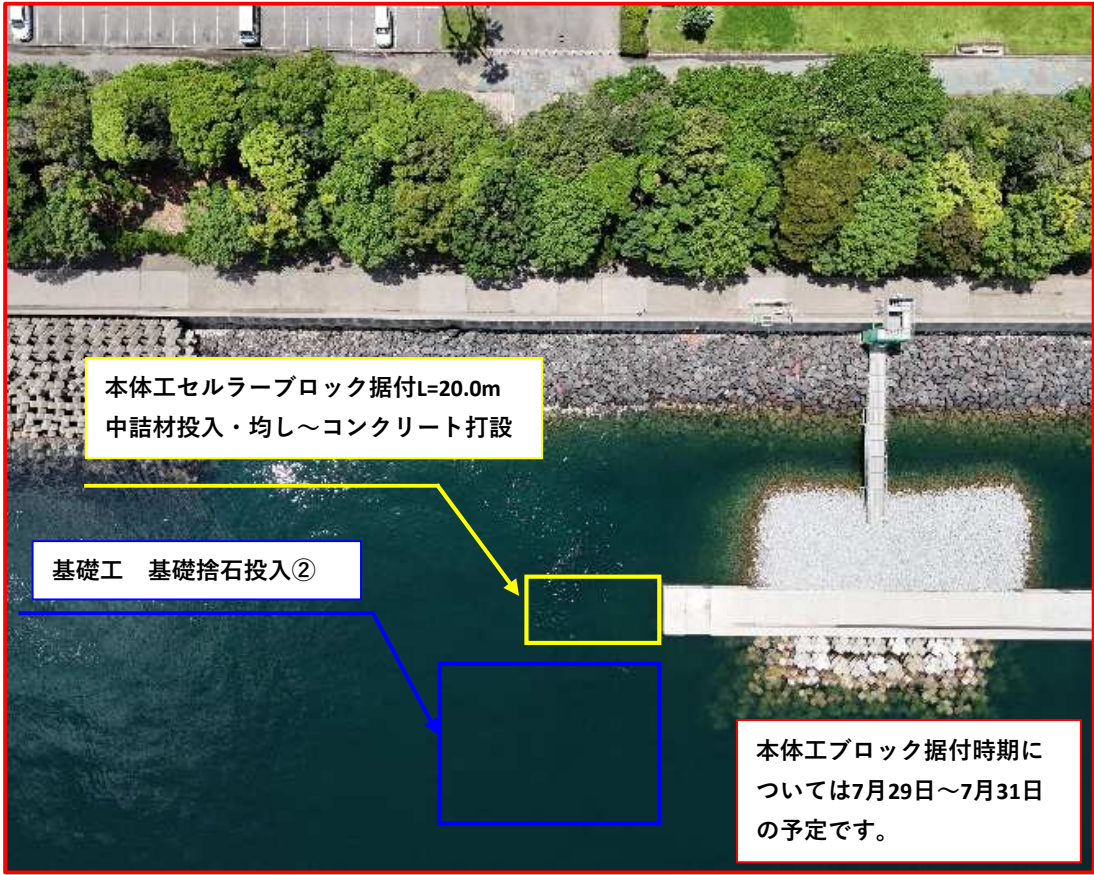

月日	曜日	作業予定	作業船係留場所
7月28日	月	本体工 セルラーストック積込 (南港)	係留なし
7月29日	火	本体工 セルラーストック積込 (谷山港)	係留なし
7月30日	水	本体工 セルラーストック据付	係留なし
7月31日	木	本体工 セルラーストック据付	係留なし
8月1日	金	本体工 中詰材投入	係留なし
8月2日	土	本体工 中詰材投入～均し	係留なし
8月3日	日	本体工 中詰材均し	係留なし
備考	天候により作業内容及び係留場所は変更が有ります。		

月日	曜日	作業予定	作業船係留場所
8月4日	月	本体工 中詰材均し	南港係留
8月5日	火	上部工 コンクリート打設①	係留なし
8月6日	水	本体工 水中検査	係留なし
8月7日	木	基礎工 基礎捨石②投入	係留なし
8月8日	金	安全対策 400 t 起重機船入港	南港係留
8月9日	土	休工	南港係留
8月10日	日	休工	南港係留
連絡先	 村上建設株式会社 0997-52-0625		
