
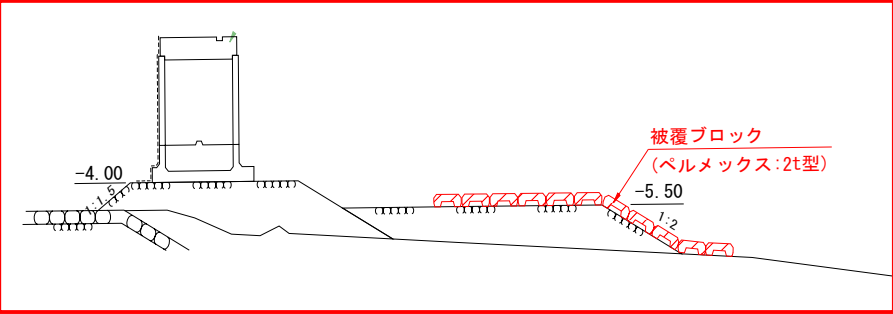
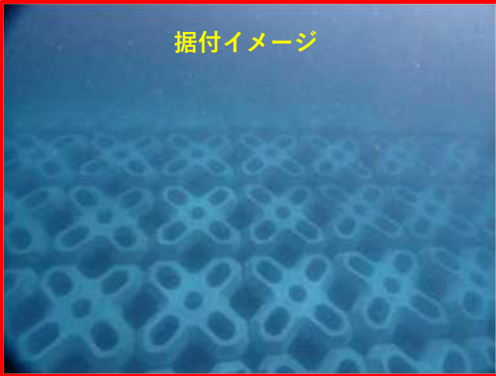


工事名： 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第7次)

2週間作業予定

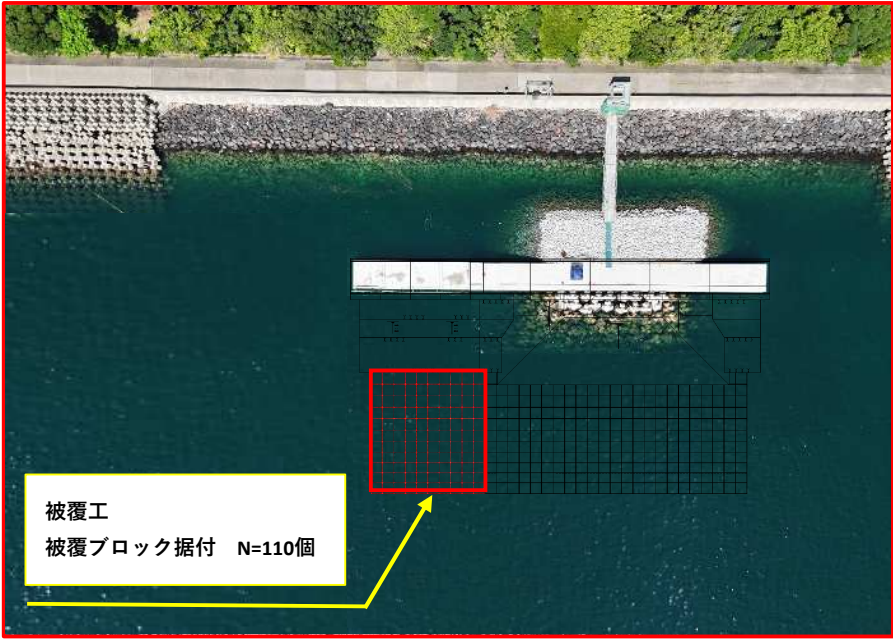

月日	曜日	作業予定	作業船 係留場所
9月22日	月	基礎工 基礎捨石②荒均し	係留なし
9月23日	火	基礎工 基礎捨石②出来形確認	係留なし
9月24日	水	基礎工 基礎捨石②出来形確認	係留なし
9月25日	木	基礎工 基礎捨石②出来形確認	係留なし
9月26日	金	基礎工 基礎捨石②出来形確認	係留なし
9月27日	土	休工	係留なし
9月28日	土	休工	係留なし
備考	天候により作業内容及び係留場所は変更 が有ります。		

月日	曜日	作業予定	作業船 係留場所
9月29日	月	被覆工 被覆ブロック積込準備	係留なし
9月30日	火	被覆工 被覆ブロック積込	南港係留
10月1日	水	被覆工 被覆ブロック据付	係留なし
10月2日	木	被覆工 被覆ブロック据付	係留なし
10月3日	金	被覆工 被覆ブロック据付	係留なし
10月4日	土	休工	係留なし
10月5日	日	休工	係留なし
連絡先	 村上建設株式会社 0997-52-0625		
