


工事名： 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第7次)

2週間作業予定

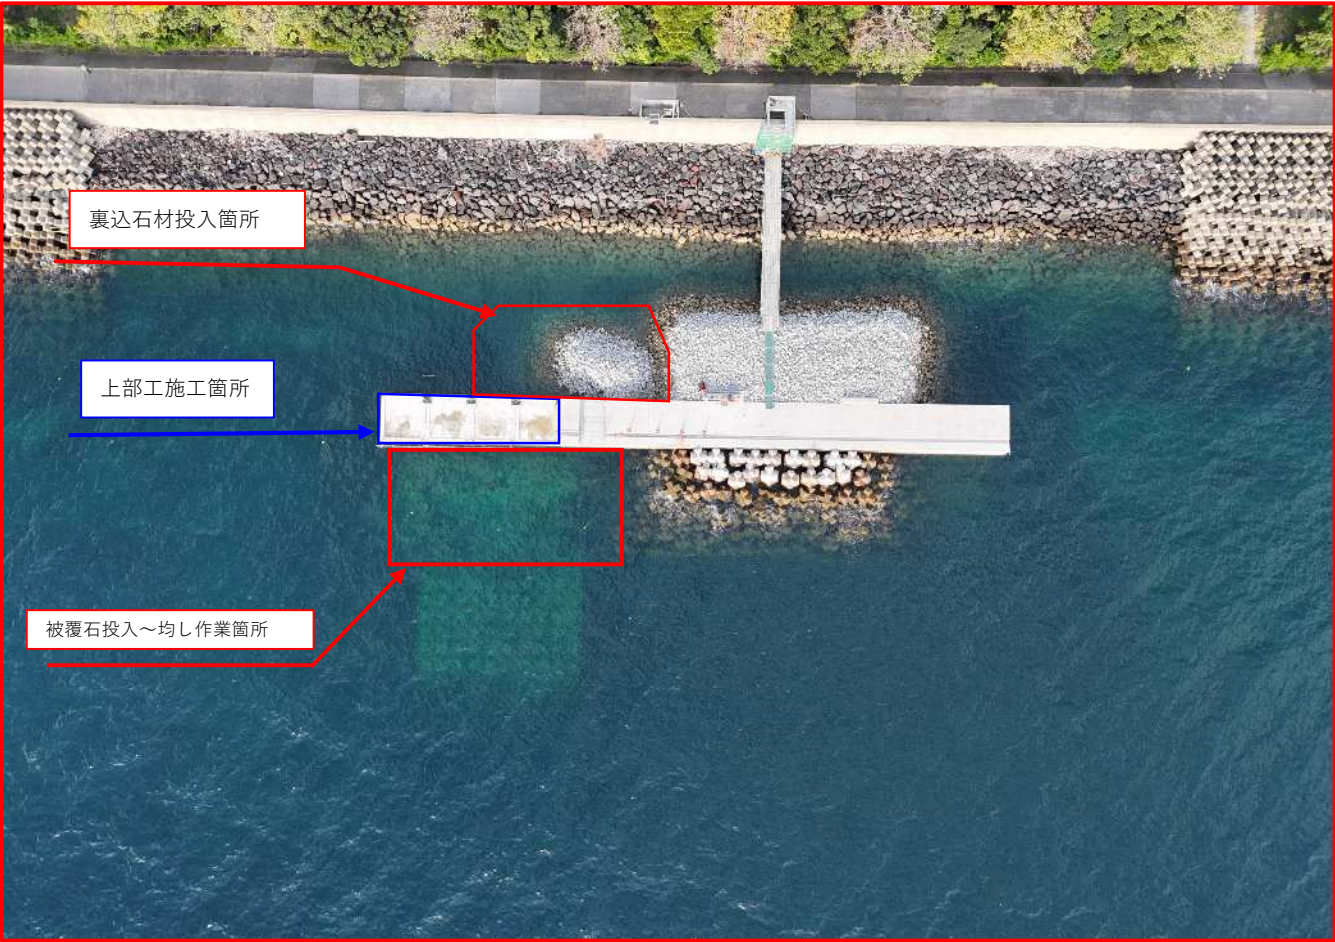

月日	曜日	作業予定	作業船係留場所
11月3日	月	休工	係留なし
11月4日	火	被覆・根固工、裏込工 石材投入	係留なし
11月5日	水	被覆・根固工 被覆石均し	係留なし
11月6日	木	被覆・根固工 被覆石均し	係留なし
11月7日	金	被覆・根固工 被覆石均し	南港係留
11月8日	土	休工	南港係留
11月9日	日	休工	南港係留
備考	天候により作業内容及び係留場所は変更が有ります。		

月日	曜日	作業予定	作業船係留場所
11月10日	月	上部工 型枠組立	現場停泊
11月11日	火	上部工 型枠組立	現場停泊
11月12日	水	上部工 型枠組立	南港係留
11月13日	木	上部工 コンクリート打設	南港係留
11月14日	金	上部工 コンクリート打設	南港係留
11月15日	土	休工	南港係留
11月16日	日	休工	南港係留
連絡先	 村上建設株式会社 0997-52-0625		
