
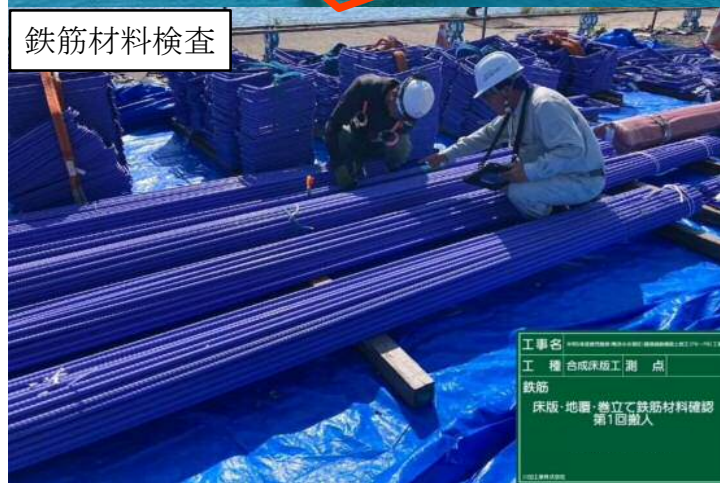


工事名：令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路橋梁上部工(P6～P9)工事
川田工業株式会社 2週間作業予定表

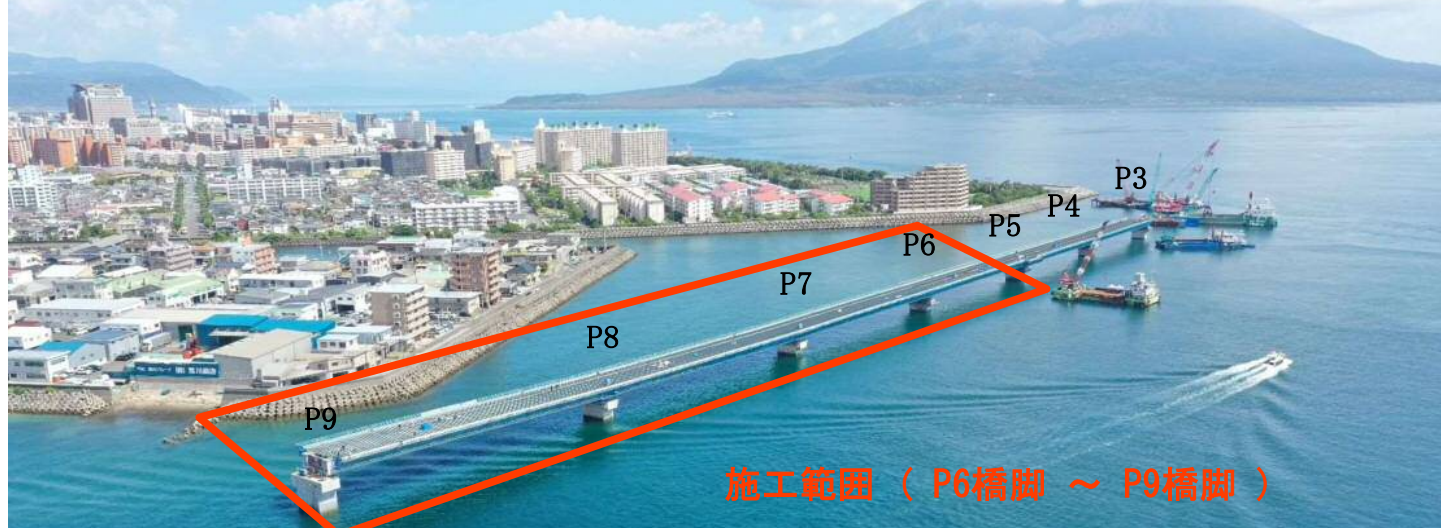

月日	曜日	作業予定	作業船の 係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の 係留場所
10/20	(月)	支承モルタル打設(海上) 巻立てコン型枠組立(海上)	南港7号岸壁	10/27		巻立てコン型枠組立(海上)	南港7号岸壁
10/21	(火)	支承モルタル打設(海上) 巻立てコン型枠組立(海上)	南港7号岸壁	10/28	(火)	巻立てコン型枠組立(海上)	南港7号岸壁
10/22	(水)	巻立てコン鉄筋組立(海上)	南港7号岸壁	10/29	(水)	巻立てコン打設段取り(海上) 合成床版鉄筋組立(海上)	南港7号岸壁
10/23	(木)	支承モルタル型枠解体(海上) 巻立てコン鉄筋組立(海上)	南港7号岸壁	10/30	(木)	巻立てコン打設(海上) 合成床版鉄筋組立(海上)	南港7号岸壁
10/24	(金)	支承モルタル仕上げ(海上) 巻立てコン鉄筋組立(海上)	南港7号岸壁	10/31	(金)	合成床版鉄筋組立(海上)	南港7号岸壁
10/25	(土)	休 工	—	11/1	(土)	休 工	—
10/26	(日)	休 工	—	11/2	(日)	休 工	—
備 考		天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。					
