


工事名： 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第7次)

2週間作業予定

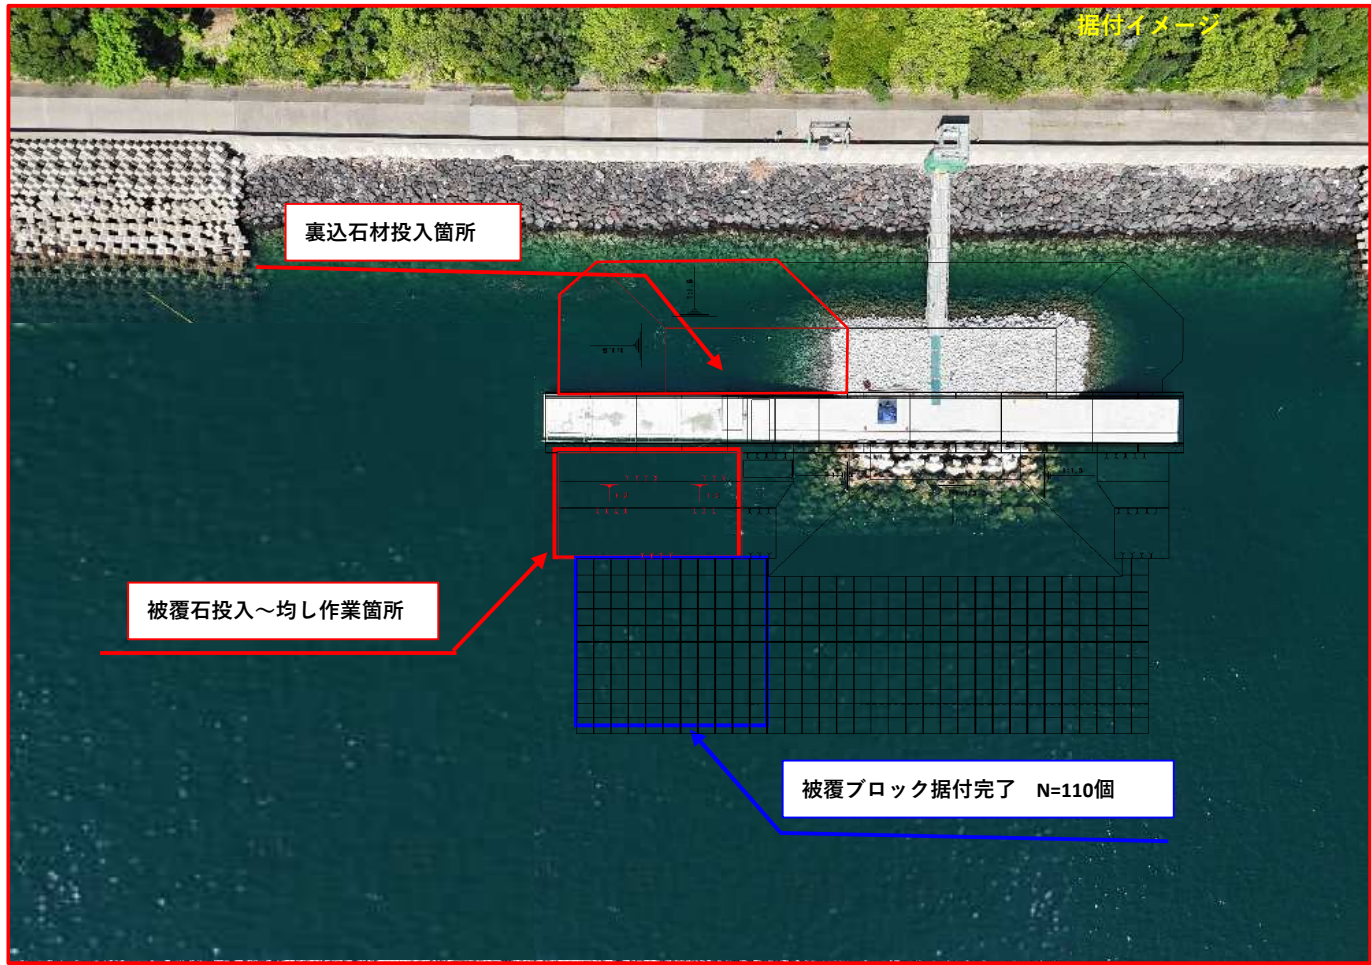

月日	曜日	作業予定	作業船 係留場所
10月6日	月	被覆・根固工 被覆ブロック出来形	係留なし
10月7日	火	被覆・根固工 被覆ブロック出来形	係留なし
10月8日	水	被覆・根固工 被覆ブロック出来形	係留なし
10月9日	木	被覆・根固工 被覆石投入	係留なし
10月10日	金	被覆・根固工 被覆石均し	係留なし
10月11日	土	休工	係留なし
10月12日	土	休工	係留なし
備考	天候により作業内容及び係留場所は変更 が有ります。		

月日	曜日	作業予定	作業船 係留場所
10月13日	月	休工	係留なし
10月14日	火	被覆・根固工 被覆石均し	係留なし
10月15日	水	被覆・根固工 被覆石均し	係留なし
10月16日	木	被覆・根固工 被覆石均し	係留なし
10月17日	金	被覆・根固工 被覆石均し	係留なし
10月18日	土	裏込工 裏込石材投入	係留なし
10月19日	日	休工	係留なし
連絡先	 村上建設株式会社 0997-52-0625		
