


工事名：令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路橋梁上部工(P6～P9)工事
川田工業株式会社 2週間作業予定表



施工範囲（P6橋脚～P9橋脚）

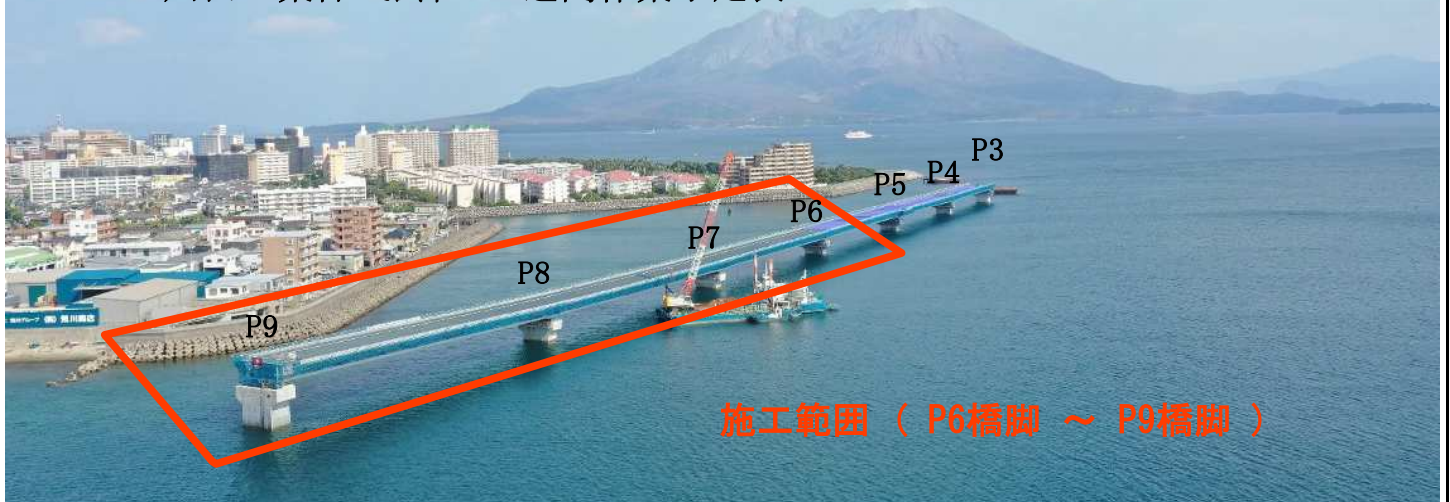

巻立てコンクリート配筋検査



巻立てコンクリート打設状況

月日	曜日	作業予定	作業船の 係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の 係留場所
11/3	(月)	合成床版鉄筋組立(海上)	南港7号岸壁	11/10	(月)	合成床版鉄筋組立(海上) 合成床版添接部塗装(海上)	南港7号岸壁
11/4	(火)	巻立てコン型枠解体(海上) 合成床版鉄筋組立(海上)	南港7号岸壁	11/11	(火)	合成床版鉄筋組立(海上) 合成床版添接部塗装(海上)	南港7号岸壁
11/5	(水)	合成床版鉄筋組立(海上)	南港7号岸壁	11/12	(水)	合成床版鉄筋組立(海上) 合成床版添接部塗装(海上)	南港7号岸壁
11/6	(木)	合成床版鉄筋組立(海上)	南港7号岸壁	11/13	(木)	合成床版鉄筋組立(海上) 合成床版添接部塗装(海上)	南港7号岸壁
11/7	(金)	合成床版架設(海上) 高力ボルト締付(海上)	南港7号岸壁	11/14	(金)	合成床版鉄筋組立(海上)	南港7号岸壁
11/8	(土)	休 工	—	11/15	(土)	休 工	—
11/9	(日)	休 工	—	11/16	(日)	休 工	—
備 考		天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。					
