


工事名： 令和6年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第7次)

2週間作業予定

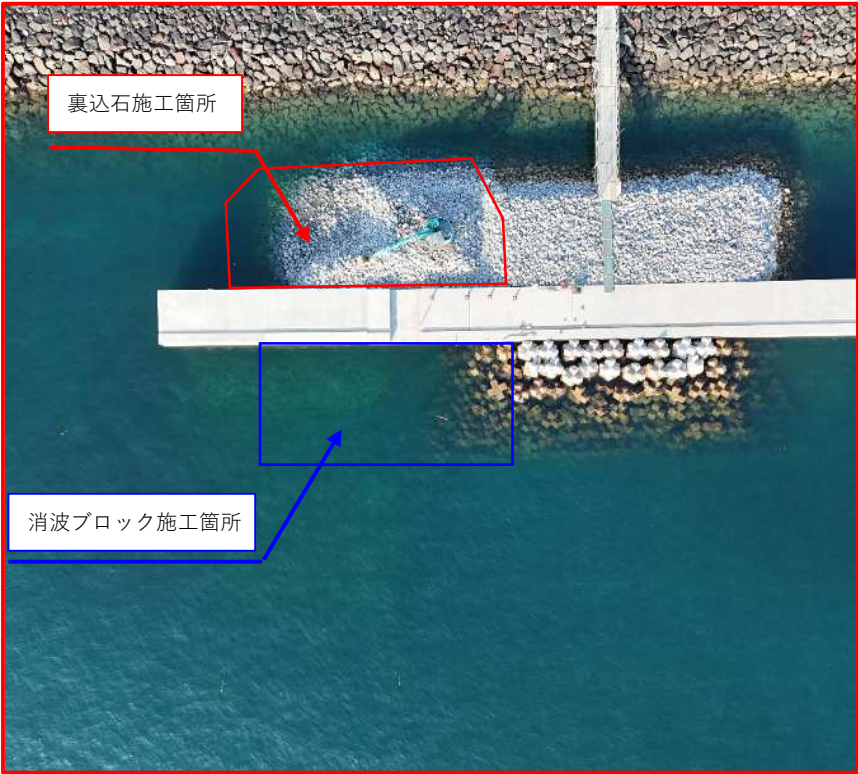

裏込工施工時、重機を使用しますので騒音に注意して作業を行います。(12月2日で作業終了予定)

消波ブロック作業時、土日の休日作業を予定しています。作業時間、騒音に注意し作業を行いますので、ご協力の程よろしくお願いいたします。

月日	曜日	作業予定	作業船係留場所
12月1日	月	裏込工 石材整形	係留なし
12月2日	火	裏込工 石材整形	係留なし
12月3日	水	裏込工 出来形確認	係留なし
12月4日	木	消波工 ブロック据付準備	南港係留
12月5日	金	消波工 ブロック据付	南港係留
12月6日	土	消波工 ブロック据付	南港係留
12月7日	日	消波工 ブロック据付	南港係留
備考	天候により作業内容及び係留場所は変更が有ります。		

月日	曜日	作業予定	作業船係留場所
12月8日	月	消波工 ブロック据付	南港係留
12月9日	火	消波工 ブロック据付	南港係留
12月10日	水	消波工 ブロック据付	南港係留
12月11日	木	消波工 ブロック据付	南港係留
12月12日	金	消波工 ブロック据付	南港係留
12月13日	土	休工	南港係留
12月14日	日	休工	南港係留
連絡先	 村上建設株式会社 0997-52-0625		
