
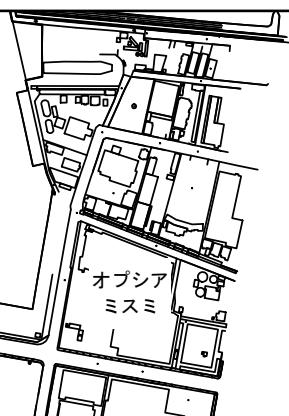
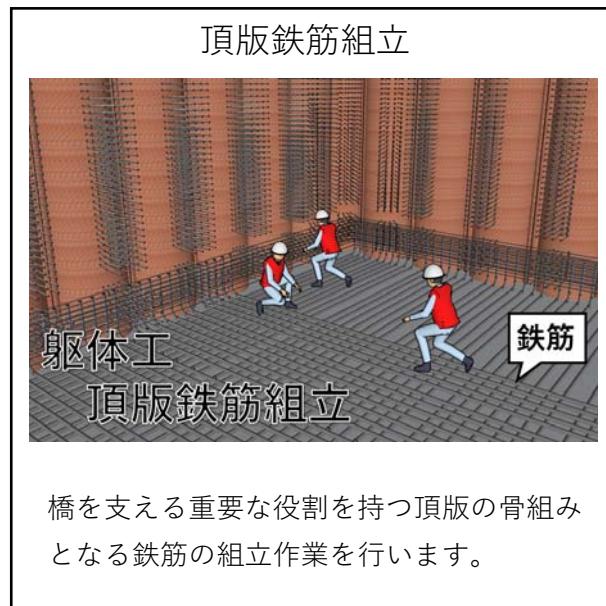


2週間作業予定表

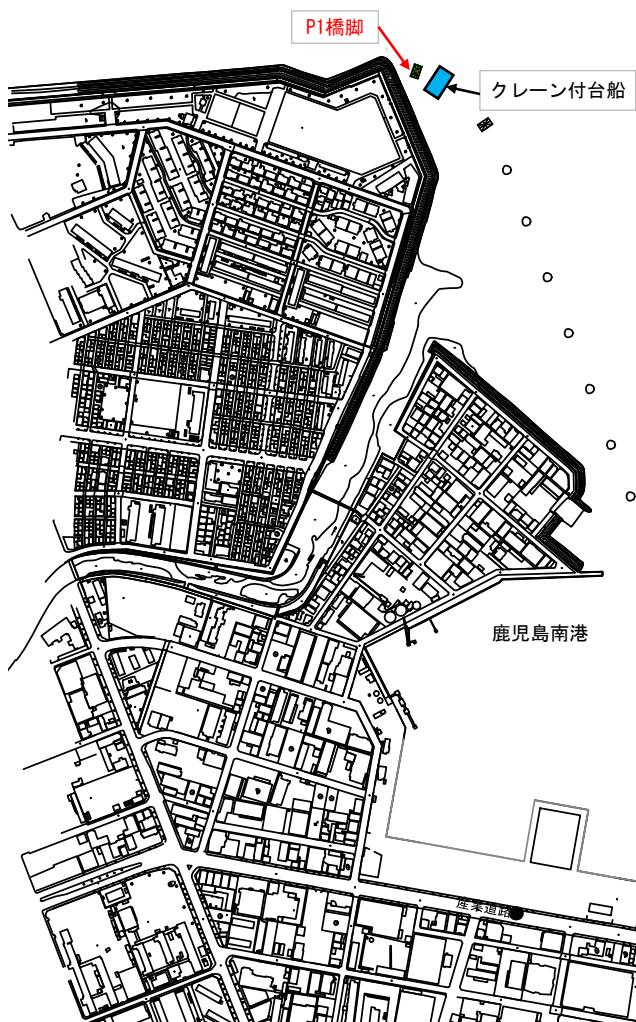

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
1/26	(月)	鉄筋組立用足場設置	P1橋脚	2/2	(月)	頂版鉄筋組立	P1橋脚
1/27	(火)	鉄筋組立用足場設置	P1橋脚	2/3	(火)	頂版鉄筋組立	P1橋脚
1/28	(水)	頂版鉄筋組立	P1橋脚	2/4	(水)	頂版鉄筋組立	P1橋脚
1/29	(木)	頂版鉄筋組立	P1橋脚	2/5	(木)	頂版鉄筋組立	P1橋脚
1/30	(金)	頂版鉄筋組立	P1橋脚	2/6	(金)	頂版鉄筋組立	P1橋脚
1/31	(土)	休工	南港	2/7	(土)	休工	南港
2/1	(日)	休工	南港	2/8	(日)	休工	南港
備考		天候等により作業内容・作業日・係留場所が変更となる場合があります。					
