


工事名：令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路橋梁上部工(P6～P9)工事
川田工業株式会社 2週間作業予定表



床版コンクリート打設完了(3回目)

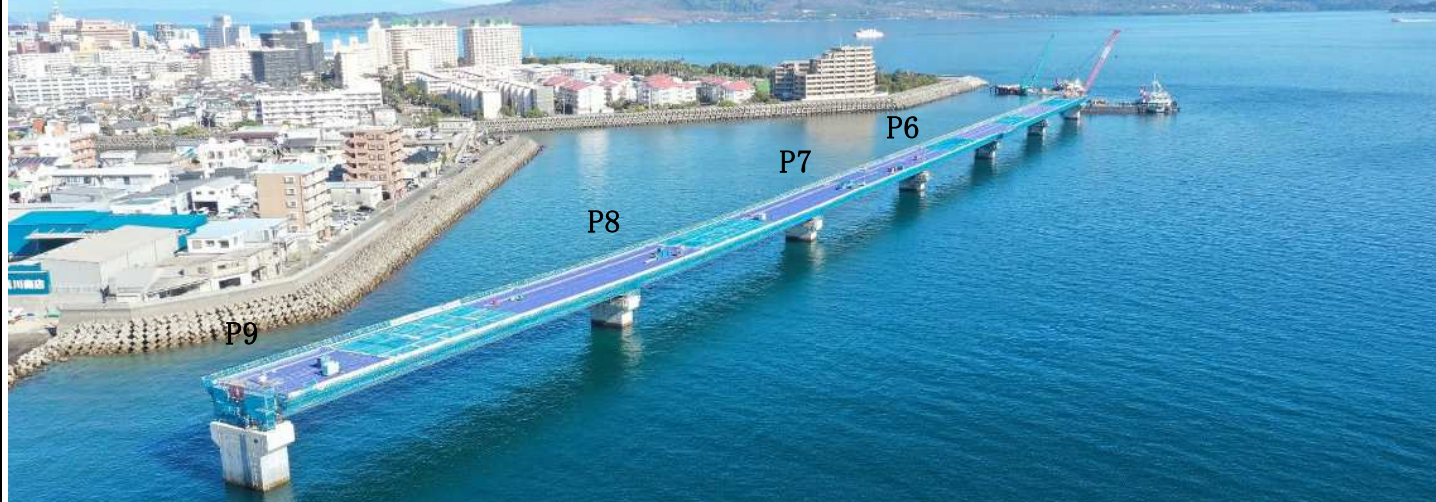

床版コンクリート打設完了(3回目)



月日	曜日	作業予定	作業船の 係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の 係留場所
1/12	(月)	休 工	—	1/19	(月)	床版コンクリート 打設準備・養生(海上)	南港7号岸壁
1/13	(火)	休 工	—	1/20	(火)	床版コンクリート 打設⑥(海上)	南港7号岸壁
1/14	(水)	床版コンクリート 打設準備・養生(海上)	南港7号岸壁	1/21	(水)	床版コンクリート 打設準備・養生(海上)	南港7号岸壁
1/15	(木)	床版コンクリート 打設準備・養生(海上)	南港7号岸壁	1/22	(木)	床版コンクリート 打設⑦(海上)	南港7号岸壁
1/16	(金)	床版コンクリート 打設⑤(海上)	南港7号岸壁	1/23	(金)	床版コンクリート 養生(海上)	南港7号岸壁
1/17	(土)	床版コンクリート 養生(海上)	南港7号岸壁	1/24	(土)	休 工	—
1/18	(日)	休 工	—	1/25	(日)	休 工	—
備 考		天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。					
