


## 2週間作業予定表

工事名: 令和4年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路橋梁下部工(P9)工事

施工者: りんかい日産建設株式会社

鹿児島港作業所TEL: 099-297-5318

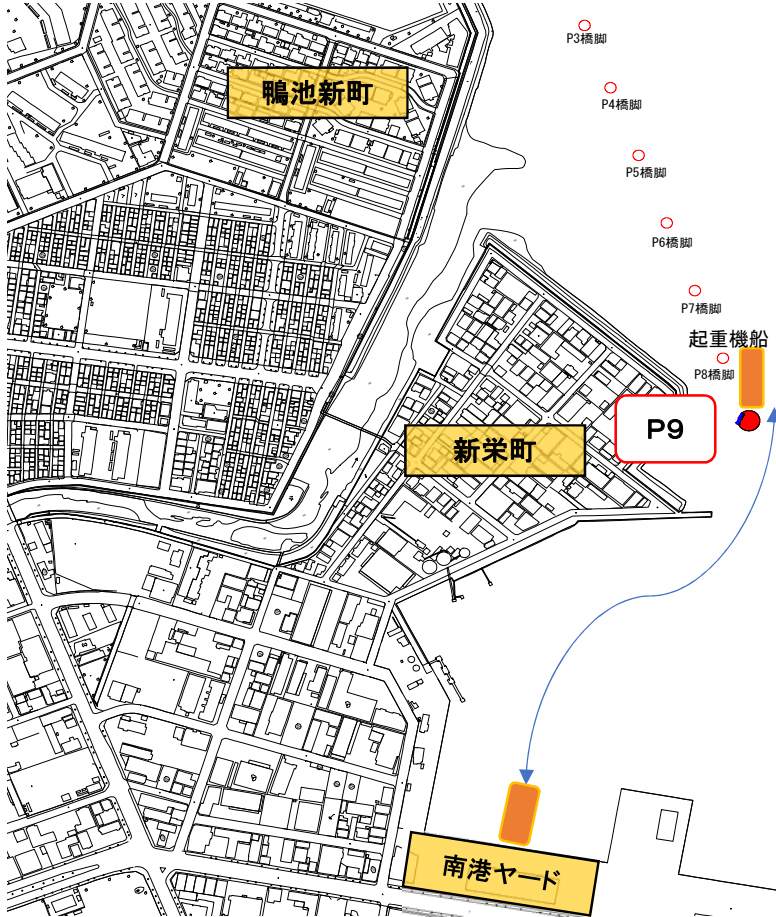

### 躯体工

#### 頂版鉄筋組立




- 頂版鉄筋の組立を行っています。
- 24日の週に頂版コンクリート打設を行います。
- 打設後はいよいよ橋脚が立ち上がっていきます。

**使用船舶**  
**【コンクリートミキサー船】**  
**【起重機船】 55t吊**



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
7/17	(月)	休工		7月24日	(月)	頂版コンクリート打設	P9
7/18	(火)	躯体型枠大組	南港	7月25日	(火)	養生 柱筋留H鋼撤去	P9
7/19	(水)	躯体型枠大組 ミキサー船回航	南港	7月26日	(水)	躯体足場	南港
7/20	(木)	躯体型枠大組 ミキサー船材料積込	P9 谷山港	7月27日	(木)	躯体足場	南港
7/21	(金)	頂版コンクリート打設準備 ミキサー船材料積込	P9 谷山港	7月28日	(金)	躯体足場	南港
7/22	(土)	ミキサー船材料積込	谷山港	7月29日	(土)	休工	
7/23	(日)	休工		7月30日	(日)	休工	
備考				備考			



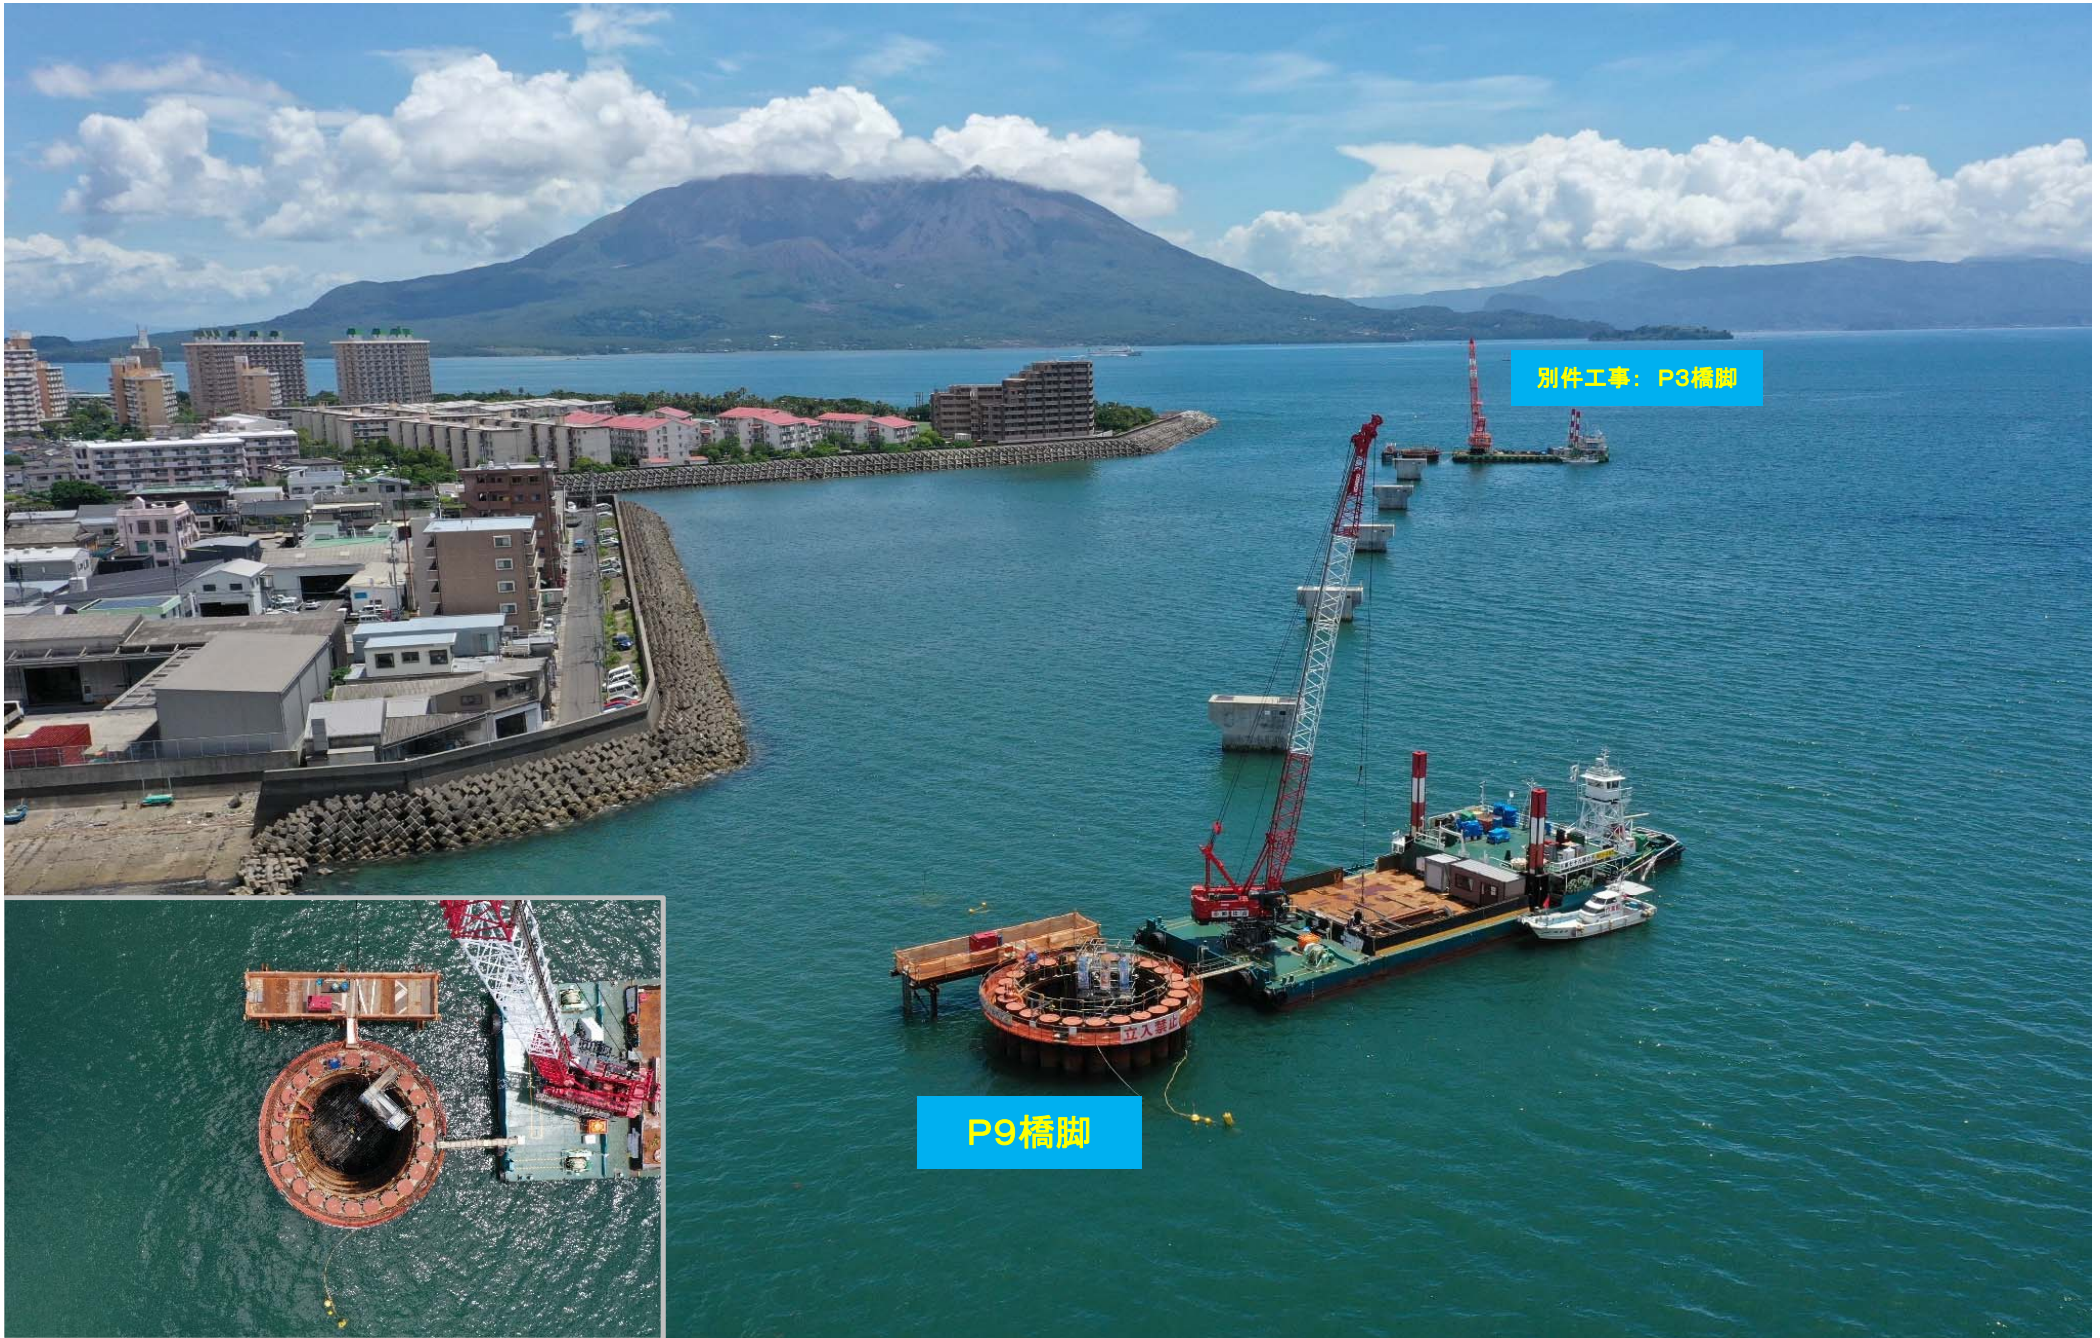

(令和5年6/27 撮影：頂版鉄筋組立状況 りんかい日産建設(株))
