


## 2週間作業予定表

工事名:令和4年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路橋梁下部工(P9)工事

施工者:りんかい日産建設株式会社


鹿児島港作業所TEL:099-297-5318

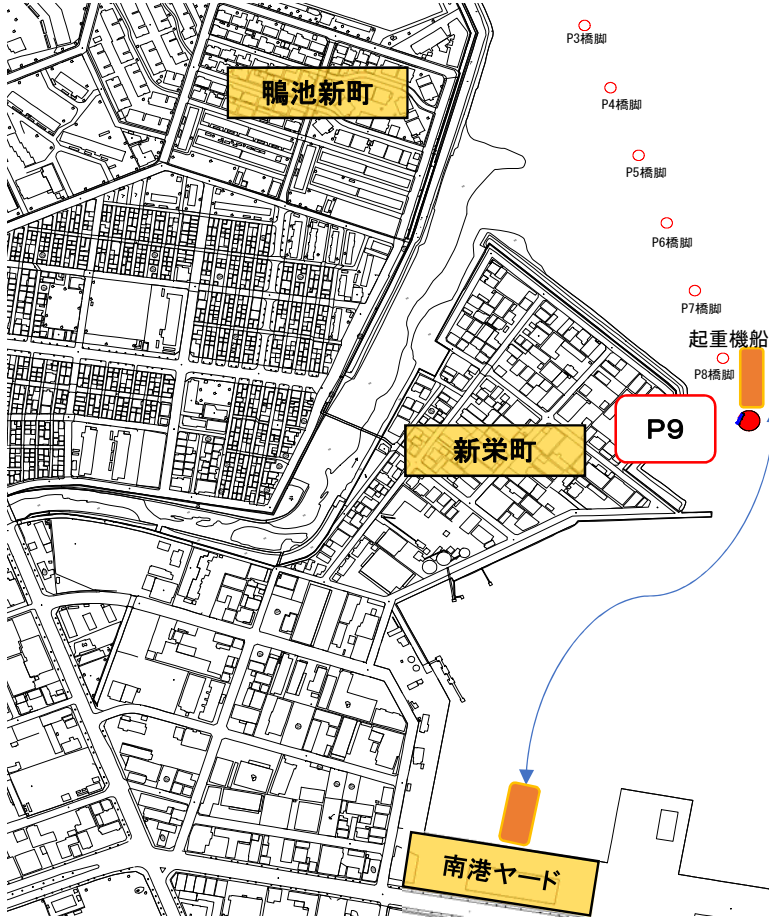

使用船舶  
【コンクリートミキサー船】  
【起重機船】55t吊



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
7/3	(月)	頂版鉄筋組立	P9	7月10日	(月)	頂版鉄筋組立	P9
7/4	(火)	頂版鉄筋組立	P9	7月11日	(火)	頂版鉄筋組立	P9
7/5	(水)	頂版鉄筋組立	P9	7月12日	(水)	頂版コンクリート打設準備	P9
7/6	(木)	頂版鉄筋組立	P9	7月13日	(木)	頂版コンクリート打設	P9
7/7	(金)	頂版鉄筋組立	P9	7月14日	(金)	養生	
7/8	(土)	休工		7月15日	(土)	休工	
7/9	(日)	休工		7月16日	(日)	休工	
備考				備考			

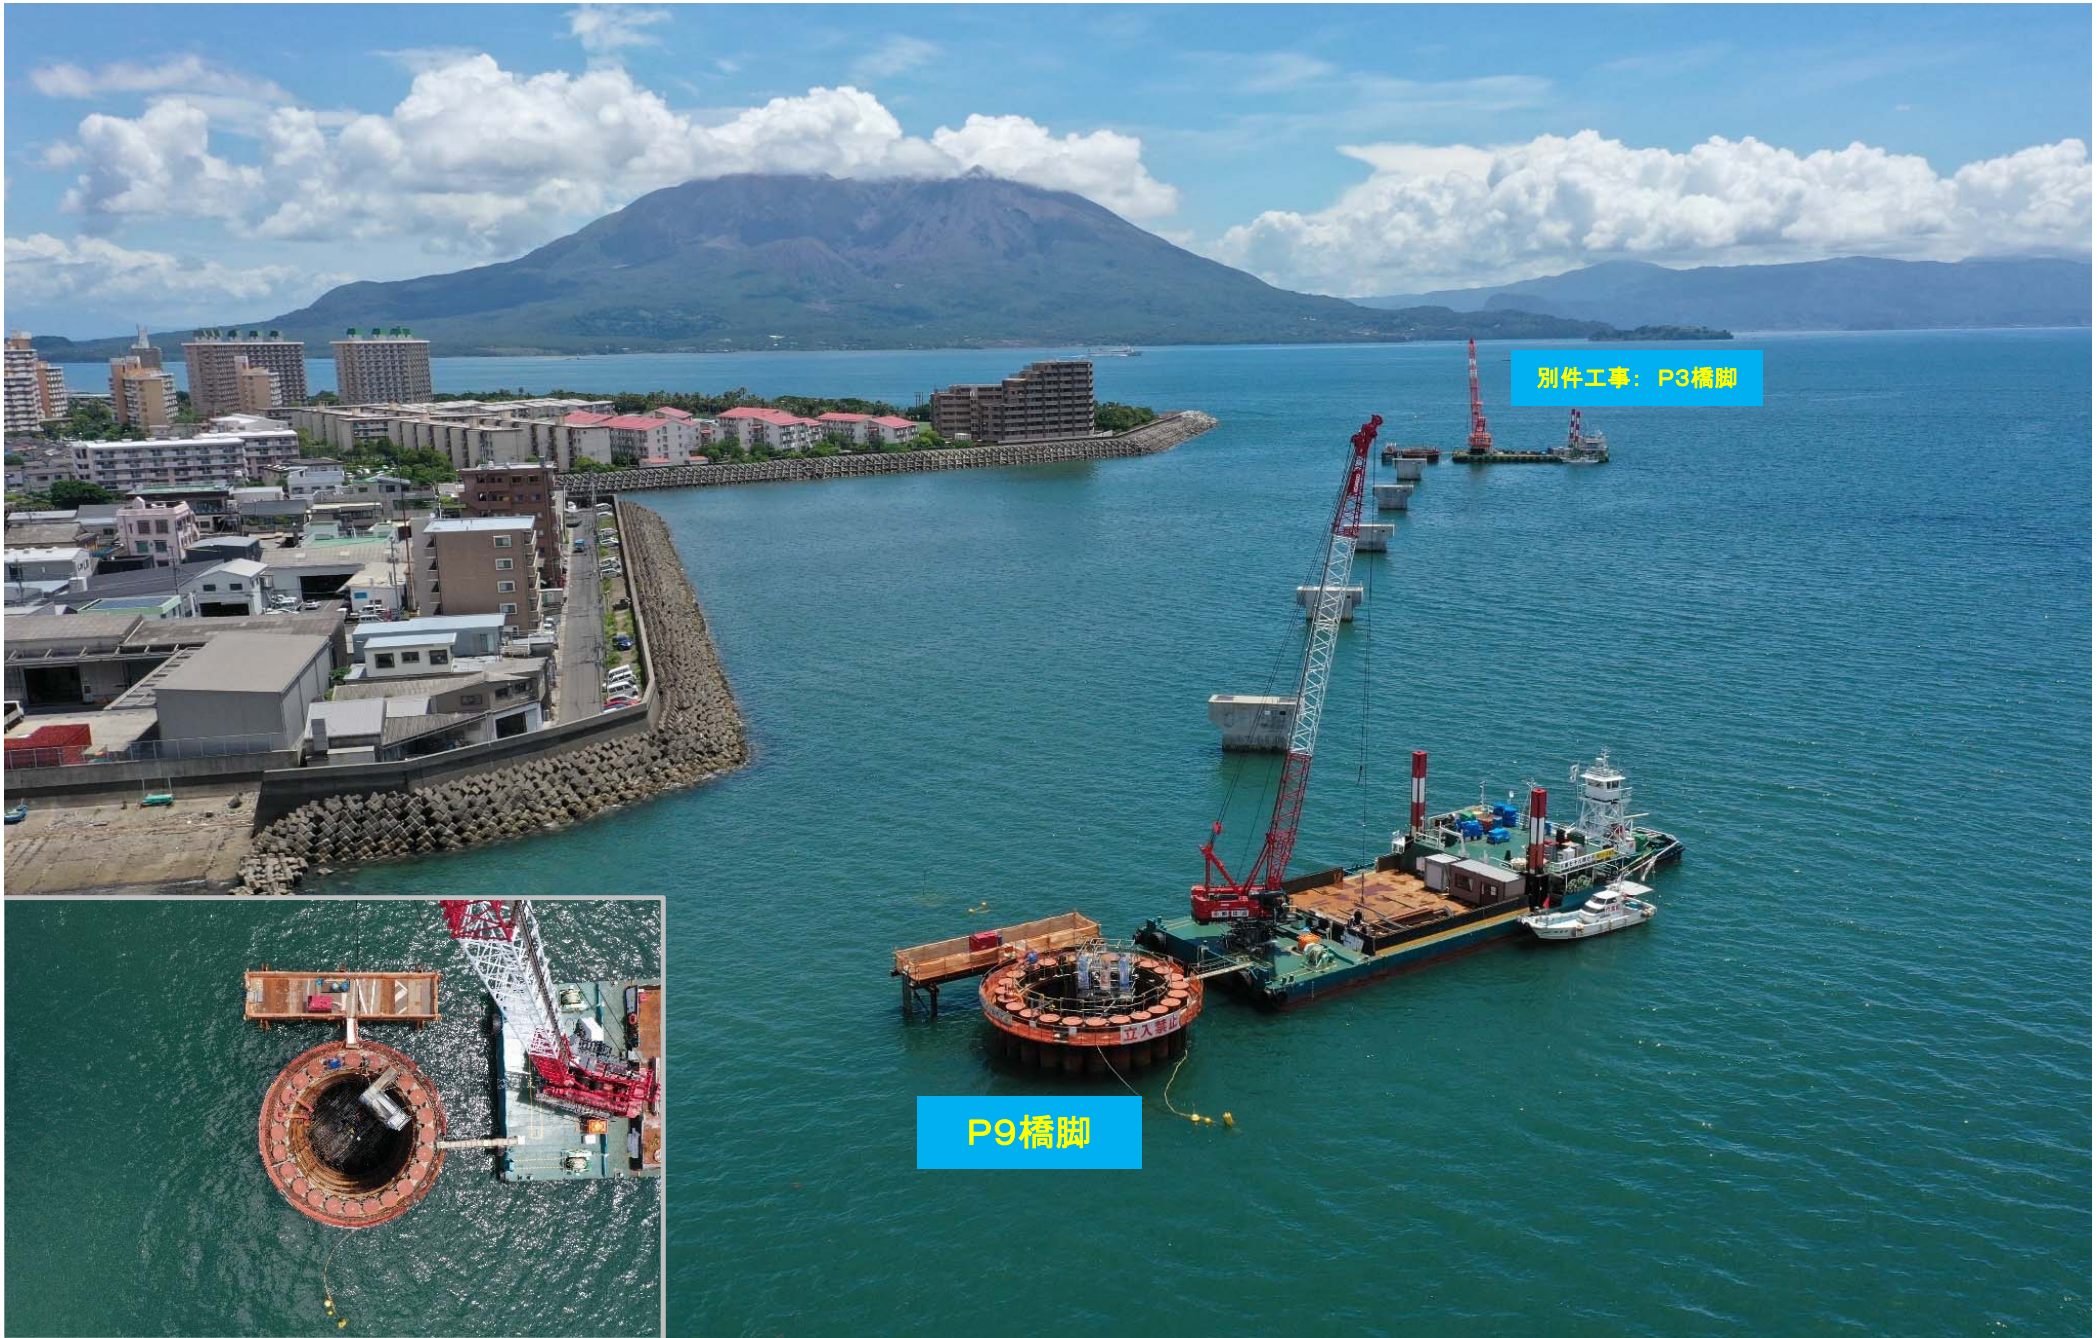

P9橋脚

別件工事: P3橋脚

(令和5年6/27 撮影: 頂版鉄筋組立状況 りんかい日産建設(株))
