


工事名： 令和5年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路護岸築造工事(第2次)

【 2週間作業予定表 】



日付	曜日	作業内容	日付	曜日	作業内容
11月20日	月	上部工 片付け・美装	11月27日	月	裏込工 防砂目地板取付
11月21日	火	上部工 片付け・美装	11月28日	火	裏込工 防砂目地板取付
11月22日	水	上部工 出来形確認検査	11月29日	水	裏込工 防砂目地板取付
11月23日	木	休工	11月30日	木	裏込工 防砂目地板出来形確認検査
11月24日	金	裏込工 防砂目地板取付	12月1日	金	被覆・根固工 ブロック積込
11月25日	土	休工	12月2日	土	休工
11月26日	日	休工	12月3日	日	休工
備考	※天候等により作業内容・作業日が変更となる場合があります。				

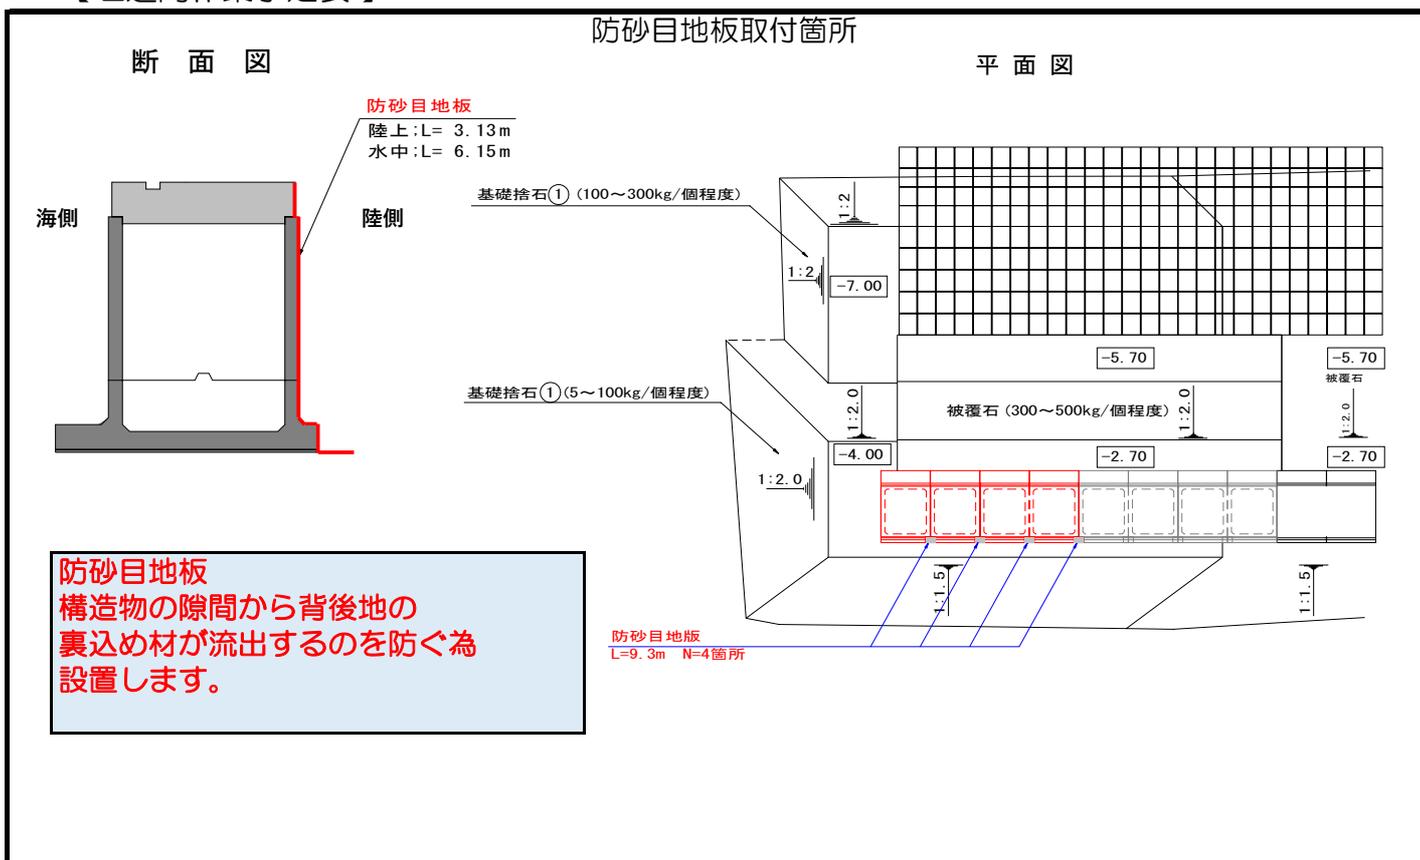

株式会社 森山(清)組
TEL 099-252-1313
www.moriyamasei.co.jp
