


工事名：令和6年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P 1）工事

2週間作業予定表

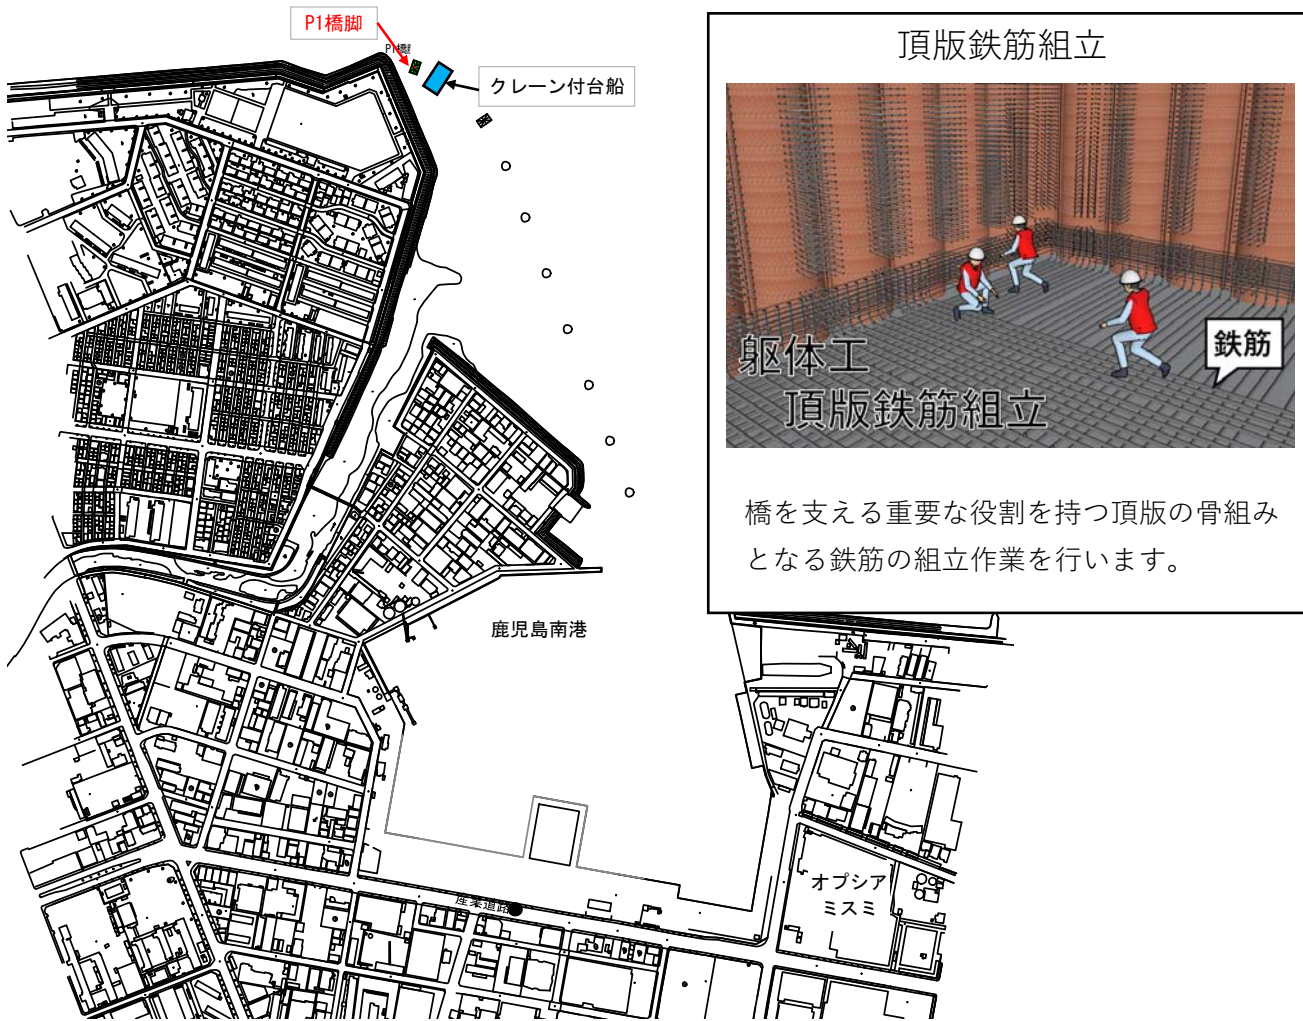

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
12/15	(月)	頂版スタッド鉄筋溶接	P1橋脚	12/22	(月)	頂版鉄筋組立	P1橋脚
12/16	(火)	頂版スタッド鉄筋溶接	P1橋脚	12/23	(火)	頂版鉄筋組立	P1橋脚
12/17	(水)	昇降足場撤去	P1橋脚	12/24	(水)	頂版鉄筋組立	P1橋脚
12/18	(木)	頂版鉄筋組立準備	P1橋脚	12/25	(木)	頂版鉄筋組立	P1橋脚
12/19	(金)	頂版鉄筋組立	P1橋脚	12/26	(金)	頂版鉄筋組立	P1橋脚
12/20	(土)	休 工	南港	12/27	(土)	休 工	木材港
12/21	(日)	休 工	南港	12/28	(日)	休 工	木材港
備考	天候等により作業内容・作業日・係留場所が変更となる場合があります。						

連絡先：みらい建設工業㈱ （099-814-9170）
