


工事名：令和6年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P1）工事

2週間作業予定表

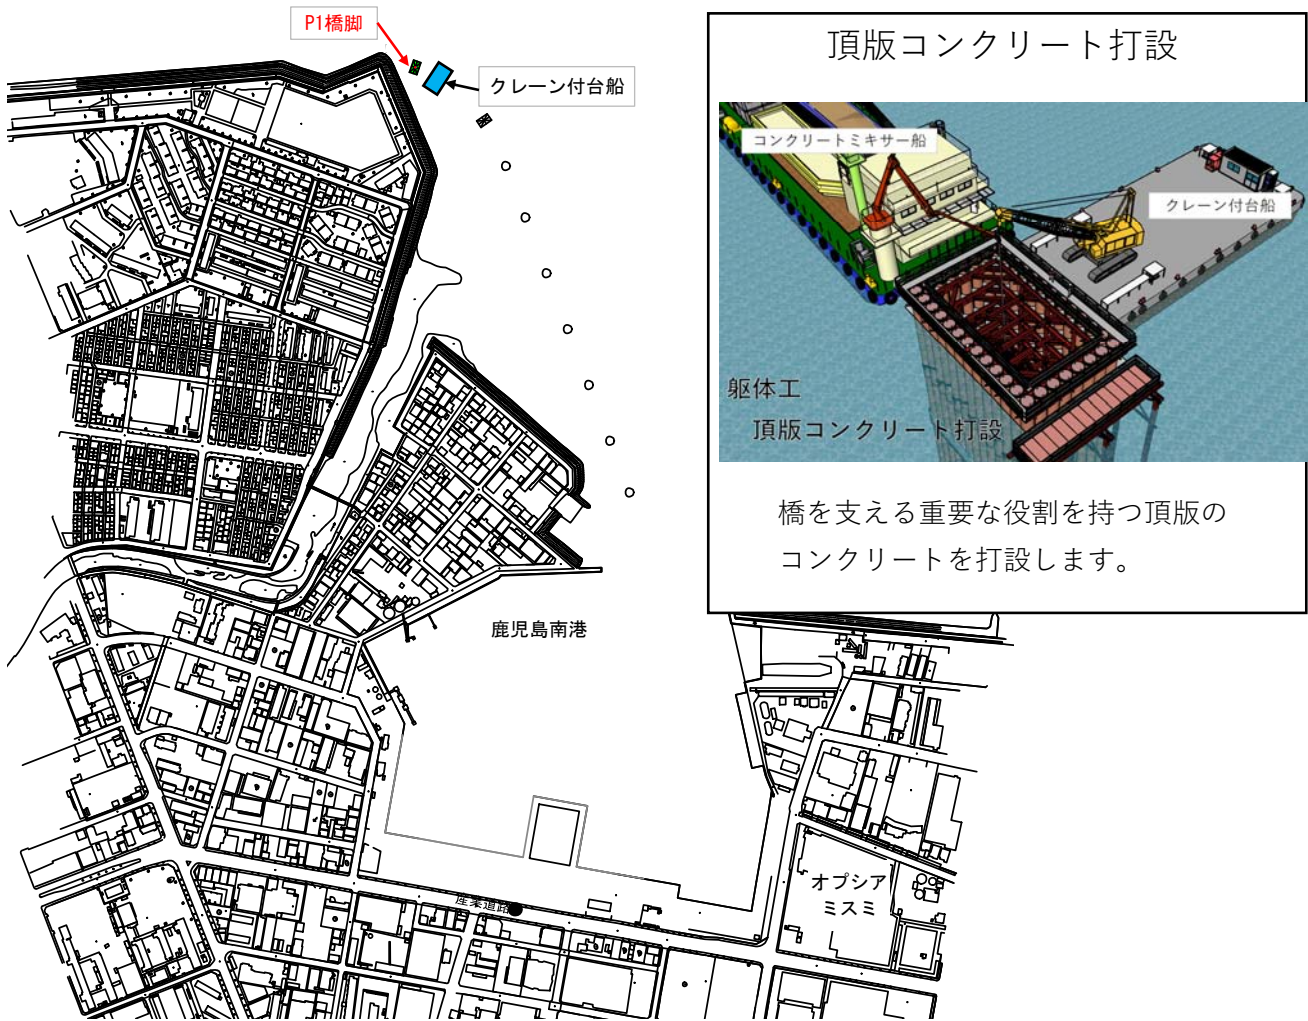

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
2/9	(月)	頂版鉄筋組立	P1橋脚	2/16	(月)	頂版鉄筋組立	P1橋脚
2/10	(火)	頂版鉄筋組立	P1橋脚	2/17	(火)	頂版コンクリート打設準備	P1橋脚
2/11	(水)	休 工	南港	2/18	(水)	頂版コンクリート打設準備	P1橋脚
2/12	(木)	頂版鉄筋組立	P1橋脚	2/19	(木)	頂版コンクリート打設準備	P1橋脚
2/13	(金)	頂版鉄筋組立	P1橋脚	2/20	(金)	頂版コンクリート打設	P1橋脚
2/14	(土)	休 工	南港	2/21	(土)	頂版コンクリート養生	南港
2/15	(日)	休 工	南港	2/22	(日)	休 工	南港
備考		天候等により作業内容・作業日・係留場所が変更となる場合があります。 2月20日(金)作業予定の頂版コンクリート打設時は、17時以降の残業が発生する可能性があります。ご不便、ご迷惑をおかけしますがよろしくお願いいたします。					

連絡先：みらい建設工業(株) （099-814-9170）
