


工事名：令和7年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P10）工事

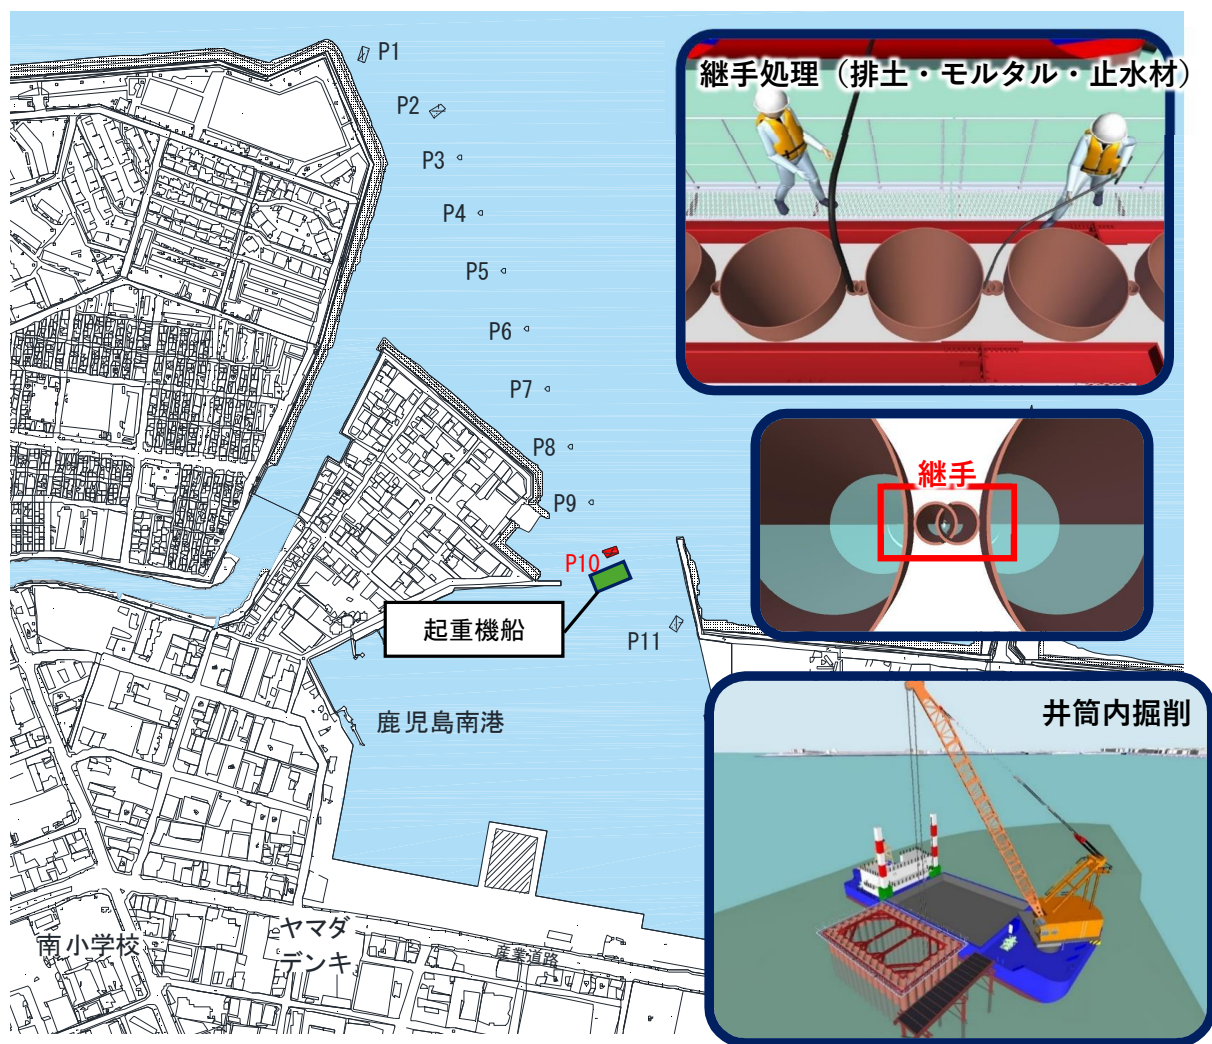

2週間作業予定

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
6/29	(月)	台風養生解除 鋼管矢板継手モルタル	P10	7/6	(月)	足場整備	P10
6/30	(火)	鋼管矢板継手モルタル	P10	7/7	(火)	井筒内掘削	P10
7/1	(水)	鋼管矢板継手モルタル	P10	7/8	(水)	井筒内掘削	P10
7/2	(木)	鋼管矢板継手モルタル	P10	7/9	(木)	井筒内掘削	P10
7/3	(金)	鋼管矢板継手止水材	P10	7/10	(金)	井筒内掘削	P10
7/4	(土)	鋼管矢板継手止水材	P10	7/11	(土)	休 工	—
7/5	(日)	休 工	—	7/12	(日)	休 工	—
備考		作業時間：8：00～17：00 天候により作業内容・作業日が変更となる場合があります。 海象の悪化により平日が休工になった際は、土曜日に作業する可能性があります。					

連絡先：東洋・本間特定建設工事共同企業体（070-3539-2325）
