


工事名：令和6年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P1）工事

2週間作業予定表

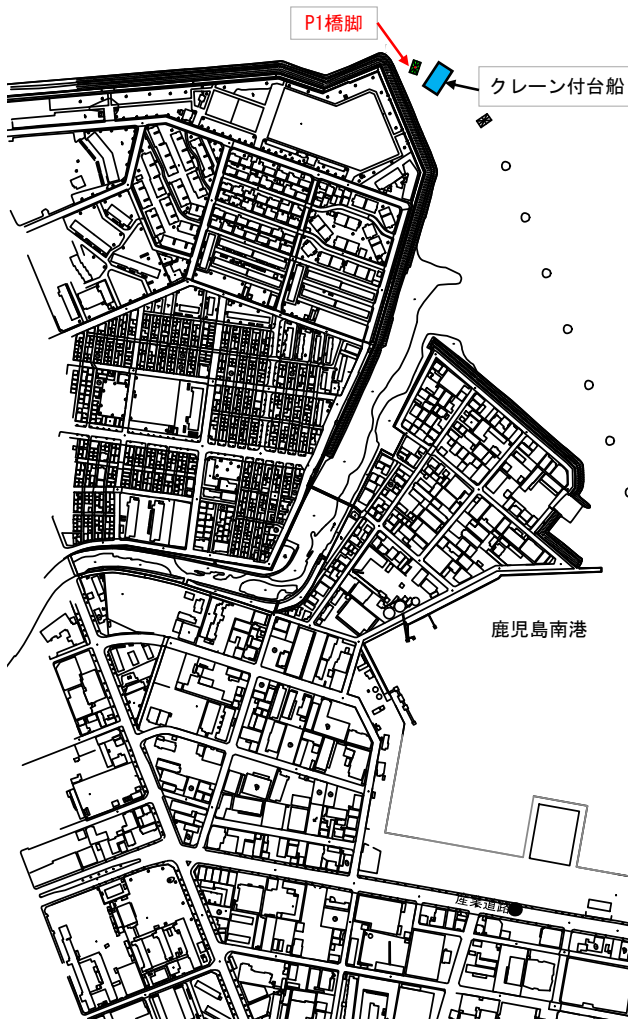

躯体コンクリート打設

A 3D computer-generated rendering of the bridge pier construction. It shows a red, grid-like structure representing the pier's body being built from the bottom up. The structure is supported by a blue and white barge. The background shows a blue sea and a white sky.

足場、鉄筋及び型枠の設置を行いコンクリートを打設するというサイクルで、下から順番に「躯体」を造り上げていきます。

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
6/29	(月)	躯体鉄筋組立(5ロット)	P1橋脚	7/6	(月)	躯体鉄筋組立(5ロット)	P1橋脚
6/30	(火)	躯体鉄筋組立(5ロット)	P1橋脚	7/7	(火)	躯体鉄筋組立(5ロット)	P1橋脚
7/1	(水)	躯体鉄筋組立(5ロット)	P1橋脚	7/8	(水)	躯体鉄筋組立(5ロット)	P1橋脚
7/2	(木)	躯体鉄筋組立(5ロット)	P1橋脚	7/9	(木)	躯体鉄筋組立(5ロット) 型枠組立(5ロット)	P1橋脚
7/3	(金)	躯体鉄筋組立(5ロット)	P1橋脚	7/10	(金)	躯体コンクリート 型枠組立(5ロット)	P1橋脚
7/4	(日)	休工	南港	7/11	(土)	休工	南港
7/5	(日)	休工	南港	7/12	(日)	休工	南港
備考	天候等により作業内容・作業日・係留場所が変更となる場合があります。						

連絡先：みらい建設工業㈱（099-814-9170）
