


工事名：令和6年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P1）工事


2週間作業予定表

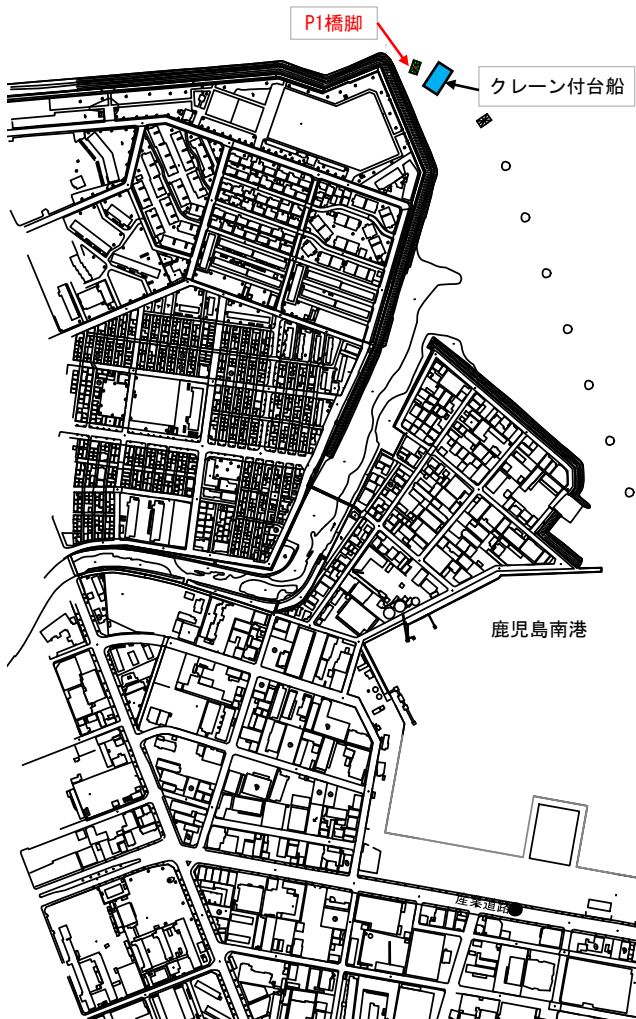

P1橋脚

クレーン付台船


鹿児島南港

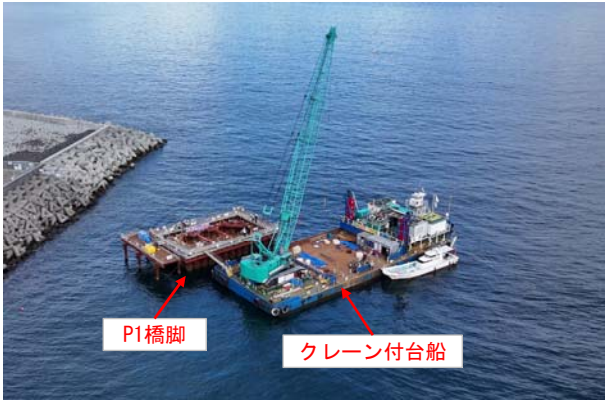

P1橋脚

クレーン付台船

躯体コンクリート打設

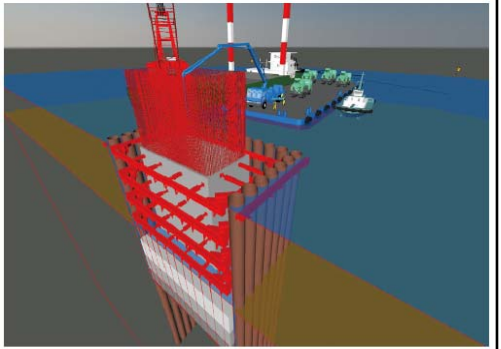

足場、鉄筋及び型枠の設置を行いコンクリートを打設するというサイクルで、下から順番に「躯体」を造り上げていきます。

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
7/13	(月)	躯体コンクリート型枠組立(5ロット)	P1橋脚	7/20	(月)	休 工	南港
7/14	(火)	躯体コンクリート型枠組立(5ロット)	P1橋脚	7/21	(火)	躯体コンクリート型枠脱枠(5ロット)	P1橋脚
7/15	(水)	躯体コンクリート打設(5ロット)	P1橋脚	7/22	(水)	支保工設置(1段目)	P1橋脚
7/16	(木)	躯体コンクリート養生(5ロット)	P1橋脚	7/23	(木)	支保工設置(1段目)	P1橋脚
7/17	(金)	休 工	南港	7/24	(金)	躯体鉄筋組立(6ロット)	P1橋脚
7/18	(土)	休 工	南港	7/25	(土)	休 工	南港
7/19	(日)	休 工	南港	7/26	(日)	休 工	南港
備考	天候等により作業内容・作業日・係留場所が変更となる場合があります。						

連絡先：みらい建設工業㈱（099-814-9170）
