

工事名：令和6年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P1）工事


2週間作業予定表



P1橋脚

クレーン付台船

鹿児島南港

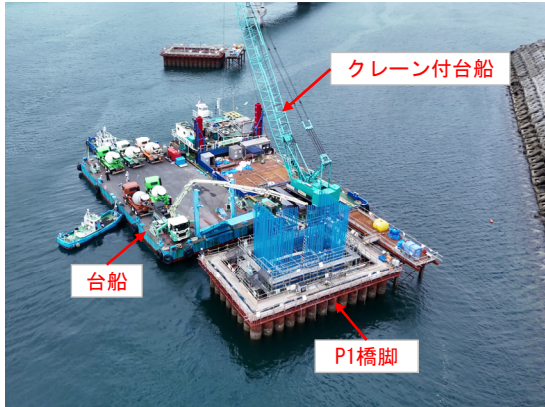


クレーン付台船

台船

P1橋脚

躯体コンクリート打設

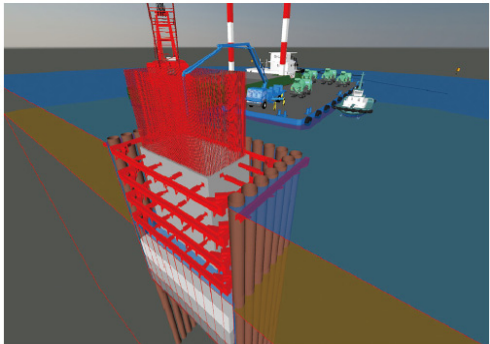

足場、鉄筋及び型枠の設置を行いコンクリートを打設するというサイクルで、下から順番に「躯体」を造り上げていきます。

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
7/27	(月)	休 工	南港	8/3	(月)	躯体コンクリート養生 (6ロット)	P1橋脚
7/28	(火)	躯体コンクリート鉄筋・型枠組立 (6ロット)	P1橋脚	8/4	(火)	躯体コンクリート養生 (6ロット)	P1橋脚
7/29	(水)	躯体コンクリート型枠組立 (6ロット)	P1橋脚	8/5	(水)	躯体コンクリート養生 (6ロット)	P1橋脚
7/30	(木)	躯体コンクリート型枠組立 (6ロット)	P1橋脚	8/6	(木)	躯体コンクリート養生 (6ロット)	P1橋脚
7/31	(金)	躯体コンクリート打設 (6ロット)	P1橋脚	8/7	(金)	躯体コンクリート型枠脱枠 (6ロット)	P1橋脚
8/1	(土)	躯体コンクリート養生 (6ロット)	P1橋脚	8/8	(土)	休 工	木材港
8/2	(日)	休 工	南港	8/9	(日)	休 工	木材港
備考		天候等により作業内容・作業日・係留場所が変更となる場合があります。					

連絡先：みらい建設工業(株) （099-814-9170）
