


工事名：令和6年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P 1）工事

2週間作業予定表

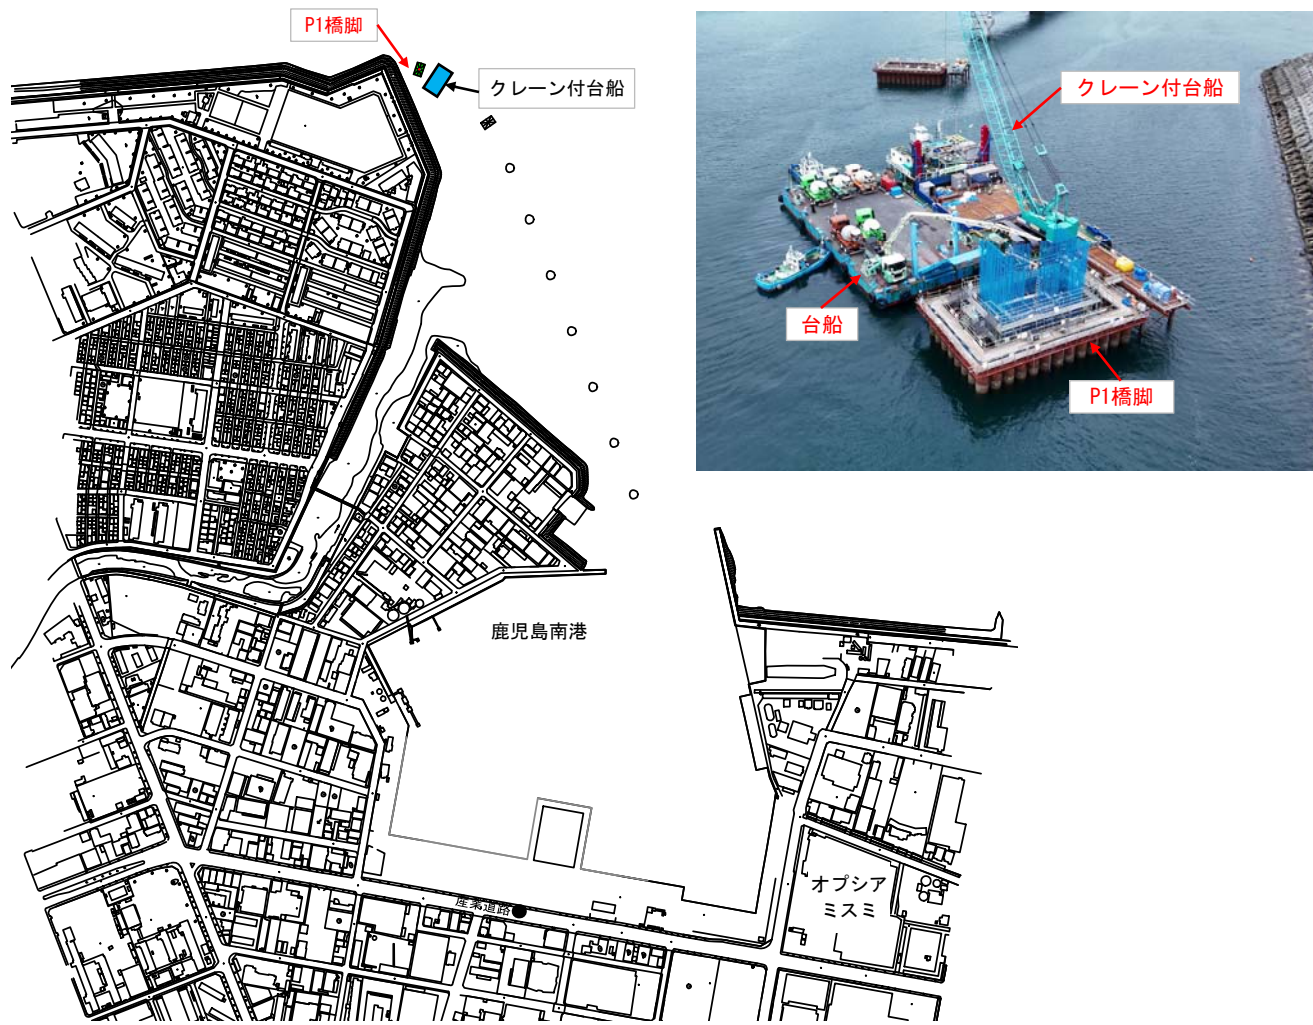

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
8/10	(月)	給油作業	木材港	8/17	(月)	支保工設置(1段目)	P1橋脚
8/11	(火)	休 工	木材港	8/18	(火)	支保工設置(1段目)	P1橋脚
8/12	(水)	休 工	木材港	8/19	(水)	プラスチックコーン 穴埋め処理	P1橋脚
8/13	(木)	休 工	木材港	8/20	(木)	プラスチックコーン 穴埋め処理	P1橋脚
8/14	(金)	休 工	木材港	8/21	(金)	プラスチックコーン 穴埋め処理	P1橋脚
8/15	(土)	休 工	木材港	8/22	(土)	休 工	南港
8/16	(日)	休 工	木材港	8/23	(日)	休 工	南港
備考	天候等により作業内容・作業日・係留場所が変更となる場合があります。						

連絡先：みらい建設工業㈱（099-814-9170）
