


週間作業予定表



仮設工

導杭・導枠設置

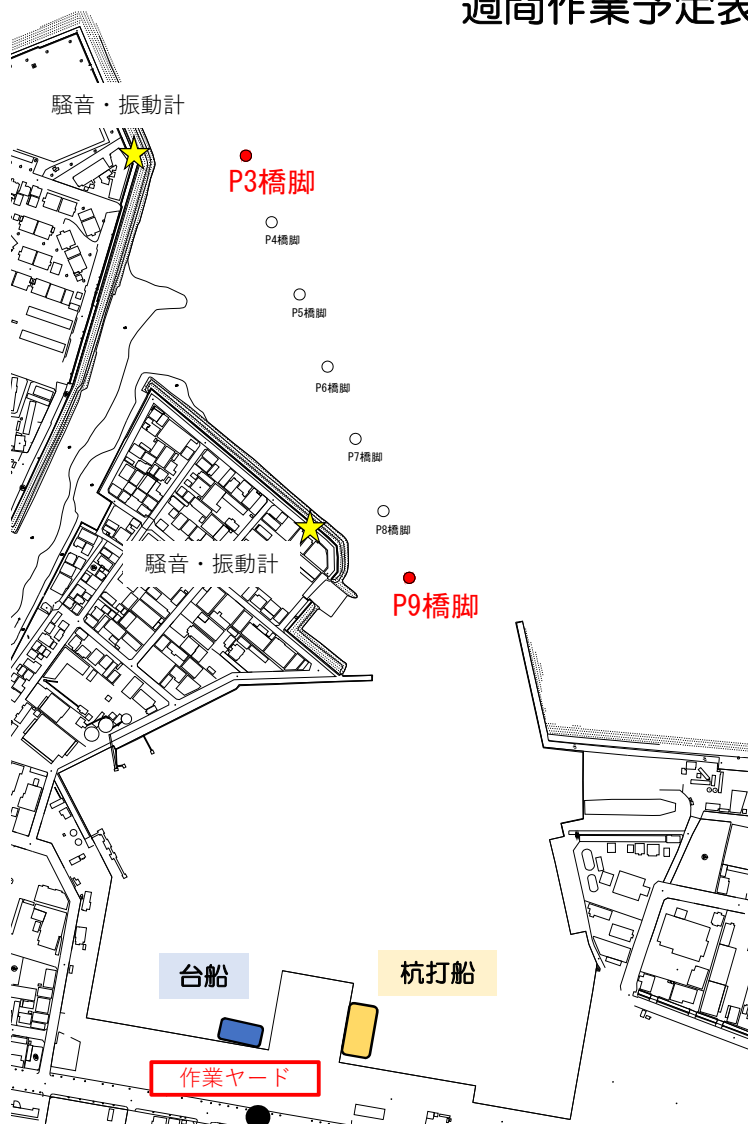

導杭・導枠設置は橋脚を支える基礎となる『鋼管矢板』を海底地盤に鉛直に打ち込むための定規を設置します。

騒音・振動計



海上での『鋼管矢板』の打ち込みに際しては、生活環境に配慮するため、陸上工事の場合に課せられる騒音・振動規制に準拠した作業を実施します。
 騒音規制値：85 db以下
 振動規制値：75 db以下

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
1/2	(月)	お休み	南港に係留
1/3	(火)	お休み	南港に係留
1/4	(水)	お休み	南港に係留
1/5	(木)	お休み	南港に係留
1/6	(金)	仮設工：作業ヤードにて台船に資材積込	南港に係留
1/7	(土)	お休み	南港に係留
1/8	(日)	お休み	南港に係留
備考			
