


## 週間作業予定表



### 仮設工

導杭・導杵設置

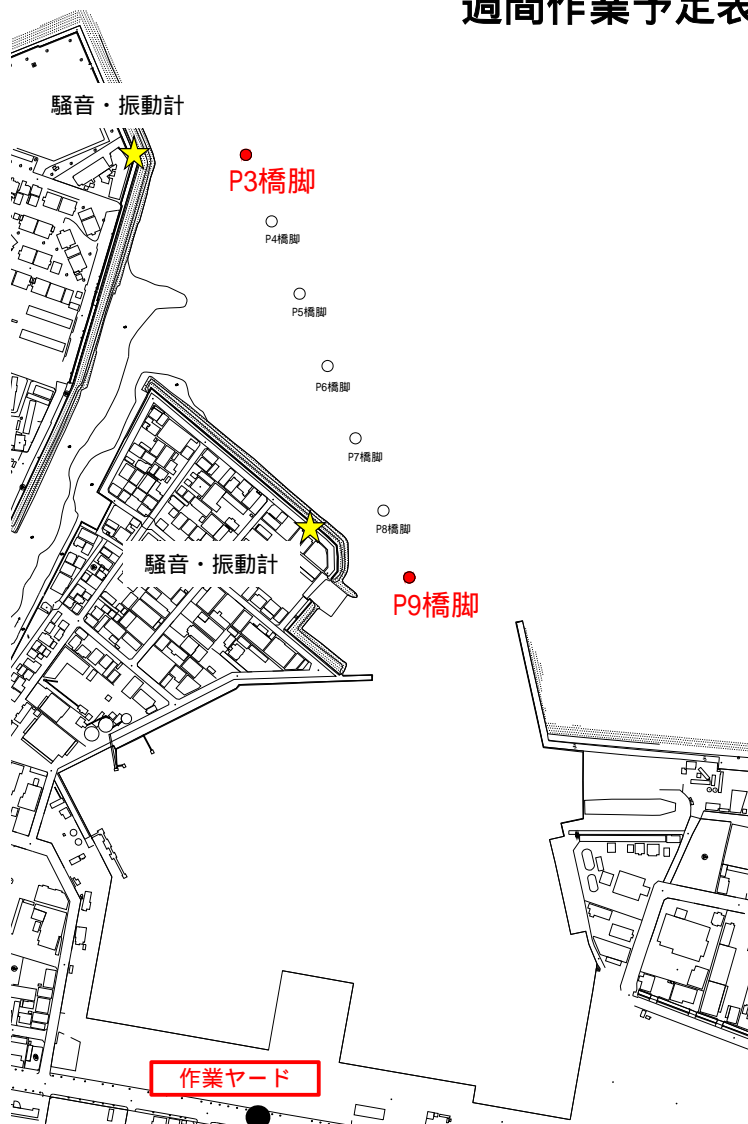

導杭・導杵設置は橋脚を支える基礎となる『鋼管矢板』を海底地盤に鉛直に打ち込むための定規を設置します。

### 騒音・振動計



海上での『鋼管矢板』の打ち込みの際は、生活環境に配慮するため、陸上工事の場合に課せられる騒音・振動規制に準拠した作業を実施します。  
騒音規制値：85 dB以下  
振動規制値：75 dB以下

月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
12/19	(月)	作業無し	海上(P9)に係留
12/20	(火)	作業無し	海上(P9)に係留
12/21	(水)	作業無し	海上(P9)に係留
12/22	(木)	作業無し	海上(P9)に係留
12/23	(金)	作業無し	海上(P9)に係留
12/24	(土)	お休み	海上(P9)に係留
12/25	(日)	お休み	海上(P9)に係留
備考			
