


週間予定表

工事名: 令和4年度鹿児島港(鴨池中央港区)臨港道路橋梁下部工(P9)工事

鹿児島港作業所TEL:099-297-5318

施工者: りんかい日産建設株式会社

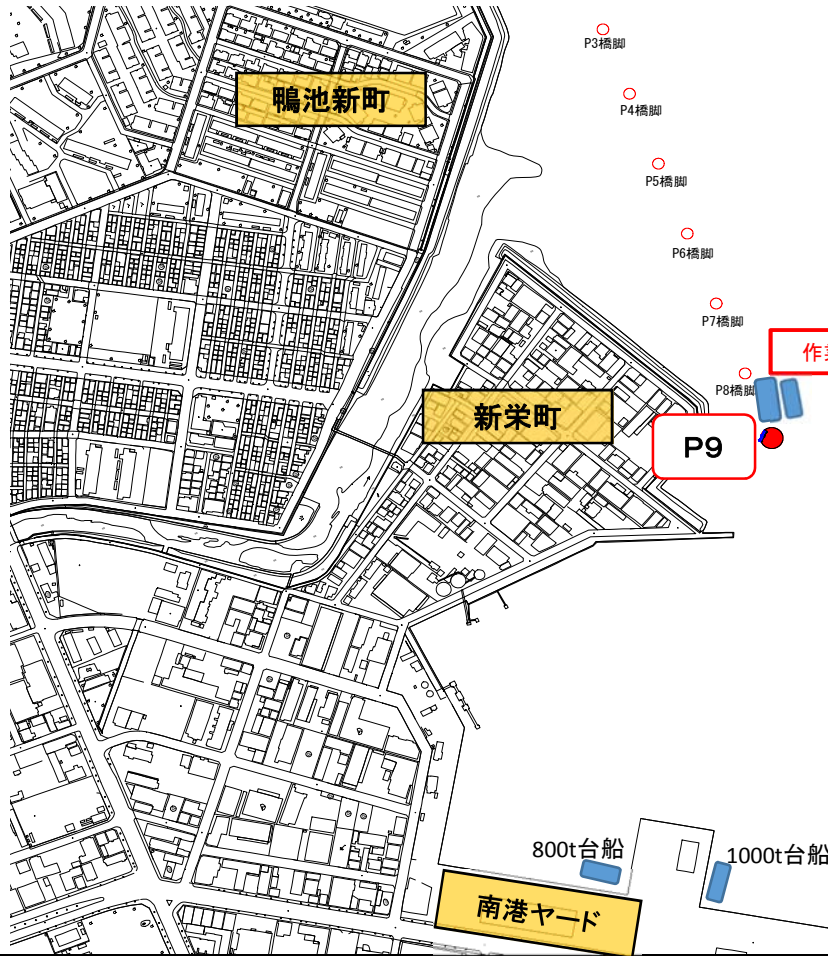

基礎工

鋼管矢板下杭



12月19日まで鋼管矢板(鉄の筒)を打設するための定規(導材)を打設します。
20日から鋼管矢板(下杭34m)24本打設します。

【起重機船】第二豊号
【台船】1000t積台船



月日	曜日	作業内容	係留位置	作業船	備考
12/19	(月)	導材設置	P9	起重機船 台船	起重機船: P9係留 800t台船: 起重機船→谷山港→南港係留 1000t台船: 南港→谷山港→起重機船係留
12/20	(火)	鋼管矢板下杭打設	P9	起重機船 台船	起重機船: P9係留 800t台船: 南港係留 1000t台船: P9係留
12/21	(水)	鋼管矢板下杭打設	P9	起重機船 台船	起重機船: P9係留 800t台船: 南港係留 1000t台船: P9係留
12/22	(木)	鋼管矢板下杭打設	P9	起重機船 台船	起重機船: P9係留 800t台船: 南港→P9係留 1000t台船: P9→南港係留
12/23	(金)	鋼管矢板下杭打設	P9	起重機船 台船	起重機船: P9係留 800t台船: P9係留 1000t台船: 南港係留
12/24	(土)	休工			19日~23日の間 パイロハンマー を使用します。
12/25	(日)	休工			
