



工事名：令和6年度鹿児島港（鴨池中央港区）臨港道路橋梁下部工（P1）工事

2週間作業予定表

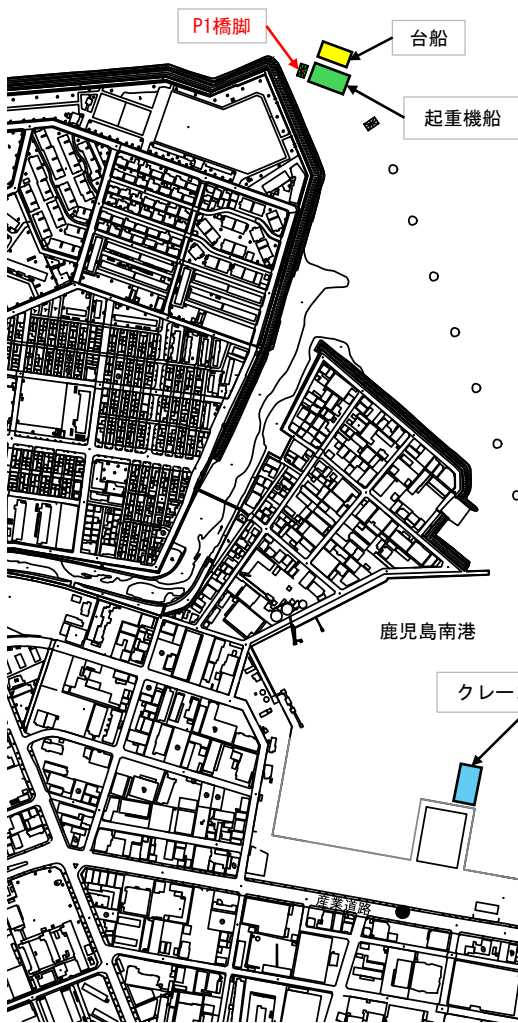

2 基礎工
こうかんやいた
鋼管矢板打設

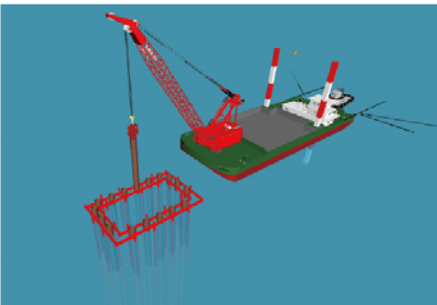

こうかんやいた
「鋼管矢板」を海底地盤に打ち込みます。鋼管矢板は橋脚1基当り38本を使用し、長方形に配置します。これを井筒と言い橋脚を支える基礎となります。



月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所	月日	曜日	作業予定	作業船の係留場所
2/24	(月)	休工	南港	3/3	(月)	鋼管矢板打設 (振動作業)	P1橋脚、南港
2/25	(火)	休工	南港	3/4	(火)	鋼管矢板打設 (振動作業)	P1橋脚、南港
2/26	(水)	現場作業なし	南港	3/5	(水)	鋼管矢板打設 (振動作業)	P1橋脚、南港
2/27	(木)	現場作業なし	南港	3/6	(木)	鋼管矢板打設 (振動作業)	P1橋脚、南港
2/28	(金)	現場作業なし	南港	3/7	(金)	鋼管矢板打設 (振動作業)	P1橋脚、南港
3/1	(土)	起重機船入港、 作業前準備	南港	3/8	(土)	休工	P1橋脚、南港
3/2	(日)	休工	南港	3/9	(日)	休工	P1橋脚、南港
備考		天候等により作業内容・作業日・係留場所が変更となる場合があります。					

連絡先：みらい建設工業㈱（099-814-9170）
